
평가 업무수행 길라잡이 **V.2.2**

2026. 6.

한국국제협력단 평가실



평가 업무수행 길라잡이 V.2.2

발행일	2026년 6월
발행	한국국제협력단 평가실
주소	경기도 성남시 수정구 대왕판교로 825(우:13449)
전화	031) 740-0691
팩스	031) 740-0914
홈페이지	http://www.koica.go.kr

본 문서의 저작권은 한국국제협력단에 있으며,

한국국제협력단의 허락없이 무단 전재와 복제를 금합니다.

□ 목적

- 본 길라잡이는 KOICA 사업평가 업무 실시에 필요한 실무적 사항에 관하여 정리함으로써 업무의 혼선을 줄이고 평가 업무관리의 효율성을 도모하기 위하여 제작되었다.
- 따라서, 본 길라잡이는 KOICA의 「사업평가 규정('23.8. 개정)」 과 KOICA에서 발간한 「프로젝트 기획, 모니터링 및 평가방법론('09.11)」에 대한 이해를 전제로,
 - KOICA 종료평가에 참여하는 이해관계자와
 - 기타 KOICA 종료평가에 대한 이해가 필요한 관계자들의 업무 이해 증진을 목적으로 한다.

□ 적용범위

- 본 길라잡이에 제시되지 않은 세부사항은 관련 규정 및 지침을 참고
 - KOICA 사업평가 규정, 전문인력 업무처리에 관한 지침, 대외무상협력사업에 관한 조달 및 계약규정, 기술평가기준, 조사연구사업규정 등
- 본 길라잡이는 사업 종료평가 관련 내용 위주로 작성되었음. 여타 평가유형에 대한 별도 문서 마련 전까지는 기본적으로 해당 문서 내 절차 및 기준을 준용하되, 평가 유형별 특징을 고려하여 일부 변경 적용하여 활용할 것을 권고

목 차

■ 용어정의	i
Ⅰ. 종료평가 업무수행 길라잡이 개요	1
1. 종료평가 개요	1
2. 종료평가 추진	4
3. 사업평가 등급제	6
4. 평가 품질관리	12
5. 평가 윤리	18
Ⅱ. 종료평가 업무수행 절차	20
1. 종료평가 기획	21
1) 종료평가 추진계획 수립	21
2) 종료평가 수행계획서 작성 및 제출	22
2. 종료평가 실시	27
1) 국내조사 실시 및 현지조사 준비	27
2) 현지조사 실시	33
3) 비대면원격조사 수행 유의사항	41
4) 현지조사 결과 제출	43
5) 중간보고회 실시	43
6) 최종점검회 실시	44
3. 종료평가 결과 제출	45
1) 종료평가 결과보고서 작성 및 제출	45
2) 평가윤리 준수도 평가 참여	56

목 차

4. 종료평가 결과 환류 및 공개	47
1) 종료평가 품질검토	47
2) 종료평가 결과 종합분석	48
3) 종료평가 결과 환류 · 공유워크숍	48
4) 종료평가 환류과제 선정 및 이행	49
5) 종료평가 교훈 및 시사점 환류	49
6) 종료평가 결과 공개	50
IV. 예산집행 및 정산	51
1. 평가 수행기관의 경우	51
1) 예산집행	51
2) 선급금 지급	51
3) 중도금 지급	52
4) 회계법인 정산 검토	52
5) 잔금 지급	52
2. 외부 전문가의 경우	53
1) 현지 조사비 지급	53
2) 국내 자문료 지급	53
3. 내부평가의 경우	53
V. 각종양식 목록	54

표 차 례

표 1. 과정평가와 성과평가	2
표 2. 종료평가 추진주체 및 주요역할	5
표 3. 종합 평가등급	7
표 4. 평가 기준별 점수 산정 기준 및 참고사항	7
표 5. 종료평가용 평가등급표	10
표 6. 평가 품질관리 기준	12
표 7. 평가 품질검토 절차	13
표 8. 평가 품질검토 기준 및 항목	14
표 9. 최종 품질등급	15
표 10. 평가품질검토 결과표	15
표 11. 평가용역 종합등급 산정 기준 및 항목	17
표 12. 국제개발협력 평가윤리지침	18
표 13. 평가윤리 준수도 평가항목	19
표 14. 종료평가 세부절차	20
표 15. 종료평가 기획시 확인 필요한 주요문서	22
표 16. 평가 수행계획서 목차 및 세부 구성	23
표 17. OECD DAC 6대 평가범주 정의 및 유의사항	24
표 18. 착수보고회 추진목적 및 주요 산출물	27
표 19. 국내조사 수행절차	28
표 20. 이해관계자 분류 예시	28
표 21. 자료분석 내용 정리 예시	31
표 22. 평가자와 KOICA 사무소 간 업무 분장 예시	32
표 23. 현지조사 사전 확인 필요사항	32
표 24. 현지조사 수행절차	33
표 25. 사전 동의서 예시 [1]	35
표 26. 사전 동의서 예시 [2]	36
표 27. 인터뷰 기록 예시	37
표 28. Focus Group Interview 예시	38
표 29. 현장 사진 기록 예시	39
표 30. 중간보고회 추진목적 및 주요 산출물	43
표 31. 최종점검회 추진목적 및 주요 산출물	44
표 32. 종료평가 결과보고서 목차 및 세부 구성	45
표 33. 사업평가 환류과제 이행체계	49
표 34. 이해관계자별 환류컨텐츠 전달체계	50

그림 차례

그림 1. 품질검토 및 후속조치 과정	14
그림 2. 문헌조사 목록 작성 단계	29
그림 3. 인터뷰 실시 절차	30
그림 4. 인터뷰 기록 잘못된 예	37
그림 5. FGI 참가자 배석도	38
그림 5. 현장사진 잘 찍은 예시	39
그림 6. 현장사진 잘못 찍은 예시	39

■ 용어정의

- 국별 평가: 수원국 내 하나 또는 여러 개의 공여국(기관)이 시행하는 사업 및 지원전략에 대한 평가
- 사 무 소: 현지 사업을 담당하는 KOICA 해외사무소
- 사업평가등급제 : 평가대상사업의 결과를 정량화하여 등급을 부여하는 제도
- 수원국참여형평가 : 평가의 설계, 실행 및 결과를 해석 시 수원국 관련자를 포함한 이해관계자가 함께 수행하는 평가
- 수원기관 : 대상사업 협의의사록에 서명한 수원국 정부부처 혹은 기관
- 수 혜 자 : 대상사업으로부터 직·간접적 수혜를 받은 이해관계자
- 분야별 평가: 동일 분야에 속하는 개발 사업에 대한 종합 평가
- 내부평가: 평가대상사업과 이해관계가 없는 타부서(지역)의 KOICA 직원이 실시하는 평가
- 종료보고 : 사업 수행의 마지막 단계로, 완료 시점에 해당 사업의 개요와 주요 경위 및 실적, 산출물 평가 결과 등을 정리한 양식의 보고
- 종료평가 : 사업 종료 단계에서 산출물 단위 중심의 성과 점검과 사업기획 및 수행 과정, 사후운영 준비도 적정성을 판단하기 위해 이루어지는 평가
- 중간평가 : 사업 수행 중에 이루어지는 모니터링 중심의 평가를 의미
- 평 가 자 : 평가를 수행하는 KOICA 직원, 외부전문가 또는 외부기관
- 평가소관부서 : 평가 실시 및 의뢰부서, 상황에 따라 평가주관부서와 평가소관부서가 같을 수 있음.
- 피평가부서: 평가대상사업을 수행 및 관리한 부서, 경우에 따라 피평가부서가 평가소관부서를 겸할 수 있음.
- 평가주관부서 : KOICA 평가 제도를 총괄 운영 및 관장하는 평가실
- 평가사업 : 평가대상이 되는 프로젝트 및 프로그램 단위의 사업
- 프로그램 평가: 전지구적, 지역별, 국가별, 분야별 특정 개발목표 달성을 위한 일련의 개발 사업에 대한 평가

■ 주요 수정내용 (2026년 6월 기준)

구분		기존 (v 2)	수정내용 (v 2.2.)	
I. 종료평가 업무수행 길라잡이 개요	2. 종료평가 추진	■ 종료평가의 추진체계 - 피평가부서를 ‘사무소’로 특정	■ (4-5페이지) 종료평가의 추진체계 - 피평가부서에는 본부의 사업관리부서가 포함되는 더 넓은 개념인바, ‘사무소’로 특정하지 않고 ‘피평가부서’ 용어를 일관되게 사용	■ 보완
	5. 평가 윤리	■ 평가윤리 준수도 평가항목	■ (19페이지) 평가윤리 준수도 평가항목 - 평가팀의 개인목적 평가활동 이용 여부에 대한 평가주체를 ‘피평가부서’에서 ‘평가소관부서’로 수정	■ 수정
IV. 예산집행 및 정산	1. 평가 수행기관의 경우	■ 예산전용 - 50% 범위에서 동일 “소”과목 내 “세” 과목 전용이 가능하며, 사전승인이 원칙	■ (51페이지) 예산전용 - “대”과목 간 전용이 원칙상 불가함을 명시 - “중”과목 내 “소”과목 간 자율전용 가능함을 명시	■ 수정
V. 각종양식 목록	표준양식 3-2 표준양식 7	■ 종료평가 표준계약서(안) ■ 평가윤리 준수도 평가	■ 양식 변경	■ 수정
			■ 신규 양식 추가 - 평가윤리준수 서약서	■ 신규

I. 평가 업무수행 길라잡이 개요

1. 종료평가 개요

□ 종료평가의 정의

KOICA 종료평가는 사업 종료 단계에서 산출물 단위 중심의 성과 점검과 사업 기획 및 수행 과정, 사후운영 준비도 적정성을 판단하기 위해 이루어진다.

□ 종료평가의 목적

다음의 목적으로 종료평가를 시행한다.

- 프로젝트 및 프로그램 사업의 집행계획과 실제 수행내용이 일치하는지 검토
- 당초 의도한 성과, 즉 최소한 산출물(output) 달성도를 얼마나 달성했는지 측정 및 사업 기획 및 수행 과정 등 적정성을 판단
 - ※ 가능한 경우 성과(outcome) 및 영향(impact) 측정을 권고한다.
- 향후 유사사업 추진을 위한 교훈 도출 등 사업의 내실을 도모하는 근거 생산

□ 종료평가의 특징

종료평가는 과정평가인 동시에 설정된 산출물 달성 여부 확인 및 향후 유사 사업의 추진을 위한 교훈도출의 목적 또한 갖는다는 측면에서 성과평가의 성격을 공유하고 있다(표 1).

표 1. 과정평가와 성과평가

구분	과정평가(Process Evaluation)	성과평가(Performance Evaluation)
특징	사업이 실행되는 과정에 초점을 두며 형성평가(Formative Evaluation)로 불림	계획한 성과가 도출되었는지 파악 총괄평가(Summative Evaluation)로 불림
기준	적절성, 일관성, 효율성, 범분야(인권·젠더·환경 등)	효과성, 영향력, 지속가능성, 범분야(인권·젠더·환경 등)
내용	· 사업 투입요소의 적절성 · 타 사업 및 국제 규범과의 일관성 · 사업 추진과정의 효율성 · 범분야 이슈(여성, 환경, 취약계층)에 대한 고려 및 기획 시 반영 여부	· 설정된 사업의 산출물 달성 여부 · 설정된 사업의 성과 달성 여부 · 사업의 영향 · 사업의 지속가능성 · 범분야적(여성, 환경, 취약계층) 성과
시기	사업수행	사업 종료 사업 종료 이후
형태	기초선조사 및 연차점검	종료평가 사후평가
목적	사업성과(목표치) 설정/관리	책무성 확보/조직 경영의 근거인 성과 데이터 확보

출처 : DFID(2005)를 참고하여 작성.



주요 평가 기준

□ 배경

○ (OECD DAC 평가범주) OECD 개발원조위원회(Development Assistance Committee, DAC)는 1991년 ‘DAC 개발원조 평가원칙을 통해 평가범주(적절성, 효율성, 효과성, 영향력, 지속가능성)를 소개하였고, 이후 국제개발과 인도주의 사업, 프로그램, 정책을 평가하는 핵심 기준으로 사용됨

- 2018-19년간 OECD DAC 평가네트워크(EvalNet)를 통해 논의와 의견수렴과정을 통해 평가범주를 개정하여, 기존 5개 평가범주를 유지 및 정의를 개선하고, 일관성(Coherence) 범주가 추가됨.

* OECD DAC에서는 평가범주 정의 개정 및 가이드라인 제시를 위해 2019년, 2021년 두 건의 문서¹⁾를 발간하였으며, 동 문서의 평가범주는 2021년 문서 기준임.

○ (변화이론 적용) 변화이론은 프로젝트 또는 프로그램이 어떻게 의도한 결과를 도출할 수 있는지 요소 간 인과관계를 밝혀 성과 중심의 모니터링과 평가를 가능하게 하는 도구로, ‘당면과제-투입-산출-성과’ 단계별로 “만약에 ~한다면, ~할 것이다”라는 인과사슬을 구성함²⁾.

- KOICA는 변화이론에 기반하여 평가대상사업을 분석하고, 이를 통해 사업모델 점검과 사업 추진과정에서의 작동(worked)/비작동(not worked)요인을 발굴하기 위해 2021년 하반기부터 분야별 변화이론 분석을 포함하여 시범평가를 실시하고 있음.

□ OECD DAC 평가범주

○ OECD DAC 평가범주는 적절성, 효율성, 효과성, 영향력, 지속가능성, 일관성으로 구분됨

- (적절성) 개입(intervention)의 목표와 설계(design)가 수혜자, 국제적, 국가별 및 개별 파트너와 기관의 수요와 정책 및 우선순위에 상응하며, 상황변화에도 지속적으로 부합하는 정도

- (일관성) 한 국가, 부문 또는 기관 내에서 특정 개입의 다른 개입과의 양립 가능성

* 내적 일관성(Internal coherence): 우리 정부·KOICA가 수행하는 특정 개입과 다른 개입간의 시너지와 상호연계성, 우리 정부·KOICA에서 준수하는 관련 국제 규범, 기준 등과의 일관성을 의미



외적 일관성(External coherence): 동일한 맥락 속에서 특정 개입과 여타 개입 간의 일관성을 의미함. 다른 개입과의 상호보완성, 조화 및 조율, 개입 간 중복방지 및 시너지효과를 통한 고부가가치화를 포함

- (효과성) 개입의 목표와 성과의 달성도 또는 예상되는 달성 정도, 수혜그룹 간 차등적 성과 등을 포함
- (효율성) 개입이 경제적이고 시의적절한 방식으로 성과를 달성하거나 달성할 가능성
- (영향력) 긍정적 또는 부정적, 의도적 또는 비의도적 여부를 불문하고 개입이 상위 차원의 효과를 달성하거나 달성시킬 것으로 예상되는 정도
- (지속가능성) 개입의 순 편익이 지속되거나 지속가능한 정도

□ 변화이론 분석

○ 수직적이고 단일한 인과관계만을 보여주는 PDM 기반 평가와 달리 변화이론을 평가에 적용할 시 사업 요소 간 작동·비작동하는 ‘중간고리(missing middle)*’를 확인할 수 있음.

* △당면과제 및 맥락 (problem and context), △개입에 영향을 미치는 사업 외부요인 (externality), △변화경로의 타당성을 입증해 줄 성과달성 가정 및 사전조건(assumption and precondition) 등

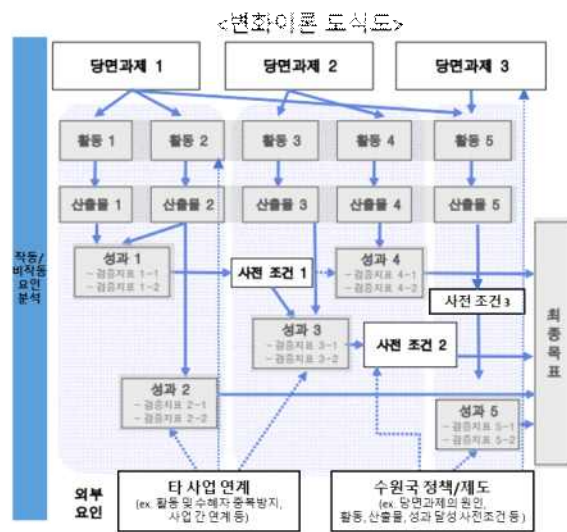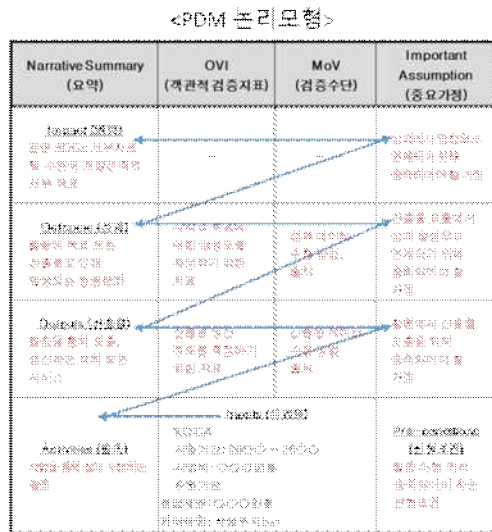

○ 사업 종료평가 과정에서 도출된 작동, 비작동요인을 포함하여 사업 전반의 변화이론 분석 필수 실시, 가능할 경우, 평가 교훈을 반영한 사업 To-Be 변화이론 모델 분석까지 실시 권고

- 자세한 내용은 평가보고서 양식 내 작성에서 참고

○ 변화이론 구성 및 평가 활용에 대한 자세한 내용은 아래 참고문헌 확인

- World Bank Group(2016). 「개발협력 프로그램 평가의 설계와 실행(The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations)」 3장, 4장
- 박수영 외(2015). 변화분석(Theory of Change)과 개발협력사업 성과관리 고찰. 국제개발협력, 10(2), 91-110.

1) OECD(2019), *Evaluation Criteria: Adapted Definitions and Principles for Use*, OECD Publishing, Paris.

OECD(2021), *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*, OECD Publishing, Paris.

2) World Bank Group(2016). 「개발협력 프로그램 평가의 설계와 실행(The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations)」

2. 종료평가 추진

□ 종료평가의 추진시점

KOICA 종료평가는 사업의 산출물(output) 성과 측정이 가능한 시점부터 가능하며, 사업 종료 차년도, 사업종료보고 이후 실시를 원칙으로 한다. 다만, 필요에 따라 종료보고와 종료평가 시기를 조율할 수 있다.

□ 종료평가의 추진방법

평가성 사정 검토를 통해 종료평가 대상사업이 최종 확정되면 평가소관부서는 종료평가 추진계획을 수립하고, 내부평가 방식 또는 외부전문가 및 기관(이하 평가자)에 위탁하여 종료평가를 실시한다.



종료평가 평가성사정 기준

- (기본 방향) 사업 책무성 및 평가 결과 영향력을 고려하여 종료평가 의무 사업 및 비의무사업을 결정하여 추진
- (세부 평가성 사정 기준) 2023년 기준, 사업예산 100억원(800만 불)이상의 사업을 종료평가 의무 사업으로 분류하고 그 이하는 비의무 대상으로 분류
 - 단, 평가 비의무사업 중 △시그니처 사업, △우수사업, △3단계 이상 사업, △그 외 사유로 평가 추진이 필요하다고 판단되는 사업은 평가위원회를 통해 실시여부 결정
 - 비의무 사업에 해당하나 평가소관부서에서 필요에 따라 자체적으로 평가를 실시할 수 있음.
- (기준 적용방식) KOICA 평가실은 매년 4분기 중 해당 평가성 사정 기준에 의거하여 평가대상사업 후보를 분류하고, 내·외부위원으로 구성된 평가위원회를 통해 차년도 연간평가계획을 심의함.
- (기준 관리방식) 평가성 사정 기준은 조직 우선순위 및 사업 포트폴리오 변경에 따라 개정될 수 있음. 이 경우, 간담회 및 워크숍, 포럼 등을 통해 이해관계자에 변경 기준 공유 및 의견 수렴 후 최종 안을 평가업무수행 길라잡이 개정 시 반영함.

□ 종료평가의 추진체계

종료평가의 효율적인 추진을 위하여 평가소관부서, 피평가부서, 평가자, 평가주관부서(평가실) 별 역할을 분담하여 업무를 수행한다(표 2).

- (평가소관부서) 종료평가 추진계획 수립, 평가자 선정 및 평가 수행 지원, 평가자의 평가윤리 준수도 평가 참여, 종료평가 결과 보고 등
- (피평가부서) 종료평가 수행 지원, 평가자의 평가윤리 준수도 평가 참여 등

- (평가자) 종료평가 수행계획 수립, 국내·현지조사 수행, 현지조사 결과보고, 평가 제언 도출 워크숍 실시, 결과보고서 등 표준 평가결과물 제출, 평가 환류·공유 워크숍 개최, 피평가자의 평가윤리 준수도 평가 참여 등
- (평가주관부서) 종료평가 추진·수행 계획의 기술 자문, 평가윤리 준수도 평가 제도 운영, 종료평가 품질검토를 위한 외부전문가 그룹(독립평가패널) 운영, 종료평가 결과 종합분석 및 결과 보고, 평가 정보 공유, 환류 등

표 2. 종료평가 추진주체 및 주요역할

추진주체	주요역할
평가소관부서	· 종료평가 추진계획 수립 · 종료평가 평가자 선정 · 종료평가 수행계획서 검토 및 확정 · 종료평가 수행 지원 · 종료평가 결과 보고 · 평가윤리 준수도 평가 참여 · 평가 제언 유용성 등 검토
피평가부서	· 종료평가 수행 지원 · 평가윤리 준수도 평가 참여
평가자	· 종료평가 수행계획 수립 및 제출 · 종료평가 국내·현지조사 수행 · 종료평가 현지조사 결과 보고 · 평가 최종점검회 실시 · 종료평가 평가결과물 작성 및 제출 · 평가환류활동 실시 · 평가윤리 준수도 평가 참여
평가주관부서 (평가실)	· 종료평가 추진 계획 및 수행계획서 자문 · 평가윤리 준수도 관리제도 운영 · 종료평가 품질검토를 위한 외부전문가 그룹(독립평가패널) 운영 · 종료평가 결과 종합분석 및 환류, 보고서 대외 공개

3. 사업평가 등급제

□ 도입 배경 및 준용 기준

제 21차 국제개발협력위원회 「자체평가에 대한 메타평가 결과 개선방안」의 일환으로 2015년 6월 국무조정실은 평가등급제를 도입했다. 이에 따라 「ODA 사업 평가등급제 시행지침」에 근거해, KOICA는 평가실에서 관리·운영하는 사후평가 및 일부 종료평가에 등급제를 적용해 그 결과를 국무조정실에 보고해오고 있다.

□ 적용 목적

KOICA는 일목요연한 사업 포트폴리오의 품질 현황을 파악하고, 증거에 기반한 조직 의사결정 강화(사업선정·홍보·조직기능 조정 등)를 목적으로 사업평가 등급제를 적용하고 있다.

□ 평가기준

OECD DAC 평가기준을 준용하며, 종료평가 시에는 ▲적절성 ▲일관성 ▲효율성 ▲효과성 ▲지속가능성 준비도를 평가 기준으로 한다. 영향력의 경우, 「ODA 사업 평가등급제 시행지침」은 사후평가 기준인 점을 감안하여 사후평가를 비롯한 국별평가, 프로그램평가, 테마평가 등의 평가수행 시에 적용한다.

□ 평가등급

평가등급은 ‘매우성공적’, ‘성공적’, ‘부분 성공적’, ‘미흡’ 4등급으로 구분되며, 평가등급별 정의는 다음(표 3)과 같다. 평가등급의 산정방법은 5개 평가 기준 각 항목에 대해 1~4점까지 점수를 부여하고, 기준별 평균 점수를 합산하여 종합점수를 산출한다(표 3, 4, 5 참고).

KOICA는 평가등급 인플레이션 현상을 방지하고 사업 성과정보 관리의 중요성을 강조하기 위해, 2021년 하반기 평가착수 사업부터 기존의 국무조정실 평가등급을 총 6개 등급(A~F등급)으로 세분화하여 활용한다. 평가팀은 각 평가등급 체계(표 3 참고)와 평가기

준별 점수 산정기준 및 참고사항, 평가 등급표(표 4, 5 참고)를 종합적으로 고려하여 최종적으로 평가등급 및 점수를 결정해야 하며, 특히 평가보고서의 주요 서술내용과 평가 등급 배정 간 괴리가 없는지 신중히 점검해야 한다.

표 3. 종합 평가등급

점수	KOICA 평가등급	국무조정실 평가등급
18점 이상	A	매우 성공적
18점 미만 16점 이상	B	성공적
16점 미만 14점 이상	C	
14점 미만 12점 이상	D	부분 성공적
12점 미만 10점 이상	E	
10점 미만	F	미흡

표 4. 평가 기준별 점수 산정 기준 및 참고사항

기 준	핵심 질문	점수 구분	참고사항
1. 적 절 성	(공통) 평가등급 산정 시 참고사항	1	대다수의 사업내용을 제대로 이행하거나 고려하지 못하여 사업성과 달성에 명백한 부정적 영향을 미침.
		2	일부 사업내용을 제대로 이행하거나 고려하지 못하여, 사업성과 달성에 일부 영향을 미침.
		3	당초 사업에서 계획한 바를 전반적으로 양호하게 달성함.
		4	사업에서 의도한 바를 모두 달성하였으며, 기대하지 않은 성과 및 달성사항을 확인함.
	· 사업은 이해관계자의 주요 정책 및 수요(needs), 우선순위를 반영하여 설계(design)되었는가?	1	한국정부(KOICA 포함) 협력전략, 수원국 정부 개발전략, 국제개발목표(SDGs 등), 사업지역 내 이해관계자 수요, 우선순위를 고려하지 않고 사업을 설계함.
		2	사업 설계가 이해관계자 수요와 우선순위에 일부 부합하나 해당 수요 및 우선순위 분석방식이 전반적으로 미흡함.
		3	사업 설계가 이해관계자 수요에 전반적으로 부합하거나 상호보완적으로 작용하며, 사업지역 내 이해관계자 수요와 우선순위 분석이 이루어짐.
		4	3의 조건을 모두 만족하며, 사전 수요조사 및 이해관계자 분석 과정에서 현지 이해관계자의 적극적인 참여 아래 문제나무, 변화이론 분석 등의 구체적 분석방식을 통해 사업 당면과제 및 수요가 충분히 검증되고 사업에 반영됨.
	· 내·외부 상황변화에 맞추어 사업 설계를 적절히 관리 및 유지하였는가?	1	사업기간 중 발생한 상황변화에 적시 대응하지 못하였으며, 이로 인해 사업성과 달성에 중대한 영향을 미침.
		2	사업기간 중 발생한 상황변화에 일부 대응하였으나 도입된 대안의 실효성 및 타당성이 다소 부족하여 당초 계획된 중요 산출물이나 성과를 미달성함.
		3	사업기간 중 발생한 상황변화에 △적기 대응하였으며, △발생가능한 위기 및 사업관리 영향에 대해 분석 및 이해관계자에 공유하고, △당초 계획을 보완한 실현가능한 대안책을 마련하여 실천하였으나, 당초 계획했던 성과목표의 일부만 달성됨.
		4	사업기간 중 발생한 상황변화에 △적기 대응하였으며, △발생가능한 위기 및 사업관리 영향에 대해 분석 및 이해관계자에 공유하고, △당초 계획을 보완한 실현가능한 대안책을 마련하여 실천하였으며, △이를 통해 당초 계획했던 성과지표를 달성하였으며, 사업의 궁극적인 목표(Goal)를 달성할 가능성이 높음.

기 준	핵심 질문	점수 구분	참고사항
2. 일 관 성	(내적 일관성) 한국 정부, 국내 타 기관, KOICA 타 사업, 주요 국제규범 및 기준과의 상호보완성, 조화/조율, 부가가치를 고려하여 사업을 추진했는가? (외적 일관성) 현지 내 타 주체 (타 공여기관, 수원국 정부 및 민간분야)의 개입과 상호보완성, 조화 및 조율, 부가가치를 고려하여 사업을 추진했는가?	1	아래 사항 중 하나 이상에 해당하는 경우 - 사업 기획단계에서 충분히 인지할 수 있는 타 개입사항이 있었음에도 불구하고, 파악 및 논의가 미비하여 사업요소 중복, 상호충돌이 발생하고 성과에 영향을 미침. - 주요 국제규범 및 기준을 명백히 위반한 사례가 확인됨.
		2	아래 사항 중 하나 이상에 해당하는 경우 - 사업 기획 및 추진 단계에서 타 개입에 대해 인지하였음에도 연계 및 조율 시도가 확인되지 않음. 다만, 타 개입과의 중복 및 상호충돌은 확인되지 않음. - 사업 성과 확산을 위한 타 개입과의 연계 가능성이 존재하고 연계 의지는 확인되나, 연계를 위한 구체적인 계획이나 조치사항이 확인되지 않음.
		3	아래 사항 중 하나 이상에 해당하는 경우 - 개입간 연계사항이 사업 기획단계에 반영되지는 못했으나, 사업 추진 과정에서 상호 협의 및 조정을 통해 일부 반영되었거나 구체적인 반영계획이 확인됨. - 사업 기획단계에서 조화 및 부가가치 창출이 가능한 타 개입을 충분히 검토하였으나, 평가대상사업과 연계가능한 타 사업이 존재하지 않아 실질적 연계가 불가하였음(이 경우 평가팀에서 별도로 교차검증 필요)
		4	사업 기획단계에서 타 개입과의 상호보완성을 인지하고 구체적인 조율·연계과정을 통해 사업 성과의 상호보완성 및 시너지효과가 확인됨.
3. 효 과 성	사업의 직접적, 일차적 산출물 (output)을 계획한대로 달성하였는가?	1	하나 이상의 산출물(output)을 현저히 달성하지 못하였으며, 해당 사유의 불가피성 및 타당성이 인정되지 않거나 사업의 중장기 성과 및 목표 달성 가능성이 매우 낮음.
		2	하나 이상의 산출물(output)을 일부 달성하지 못하였으며, 해당 사유의 불가피성 및 타당성이 일부 인정되나 사업의 성과 및 목표 달성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높음.
		3	최종 PDM 내 대부분의 산출물(output)을 달성하였으며, 일부 요소에서 정량적, 정성적으로 미흡한 면이 확인되나 해당 사유의 불가피성 및 타당성이 충분히 인정되며 극복 가능함.
		4	최종 PDM 내 모든 산출물(output)을 100% 이상 달성하였으며, 사업 산출물의 품질이 우수하여 사업의 중장기성과 및 목표달성에 기여할 가능성이 높음.
	사업의 중장기 성과(outcome) 및 목표(goal)를 달성하였거나 달성할 것으로 예상하는가?	1	최종 PDM 내 성과(outcome)를 전혀 달성하지 못하였거나 달성할 가능성이 없음. 사업에서 설정한 당면과제 및 최종목표가 명확하지 않거나 현실에 부합하지 않으며, 달성 가능성도 낮음.
		2	최종 PDM 내 일부 성과(outcome)를 달성하였거나 달성할 것으로 예상되나, 사업 기획단계에서 설정한 당면과제의 해결과 최종목표 달성 가능성은 현시점에서 뚜렷하게 확인되지 않음.
		3	최종 PDM 내 대부분의 성과(outcome)를 달성하였거나 달성할 것으로 예상됨. 일부 선결과제 혹은 위기 상황이 해결될 경우 사업에서 의도한 최종 목표 달성 가능성이 상당함.
		4	최종 PDM(혹은 ePDM) 내 모든 성과(outcome)를 달성하였으며, 해당 지표는 사업의 실제 성과를 대표할 수 있도록 설정됨. 기획단계부터 사업의 당면과제와 최종 목표를 명확히 설정하였으며, 해당 사업으로 최종 목표를 달성할 수 있는 인과성(causality)이 확인됨.
	해당 사업 사회적 소외계층을 포용하여 형평성있게 성과를 달성하였는가?	1	사업기획 및 추진 단계에서 사회적 소외계층에 대한 고려가 미흡하며, 사업의 부정적 파급효과로 인해 취약계층의 제약요인 및 취약성을 명백히 심화시킨 사례가 확인됨.
		2	사업기획 및 추진 단계에서 사회적 소외계층에 대한 고려가 미흡하며, 사업 결과 취약계층에 미치는 영향을 확인하지 못함.
		3	아래 사항 중 하나 이상에 해당하는 경우 - 사업의 기획 - 추진 - 성과 달성 측면에서 사회적 소외계층에 대한 사업성과 달성을 위한 조치가 이루어졌으나, 실제 사업의 정성적, 정량적 성과에서 관련 내용을 특정하여 평가하기 어려움. - 사업기획 및 추진 단계에서 사회적 소외계층에 대한 고려가 두드러지지 않는으나, 사업 파급효과로 인해 취약계층의 역량강화 및 상황개선이 확인됨.
		4	사업의 기획 - 추진 - 성과달성 측면에서 사회적 소외계층에 대한 사업성과 달성을 위해 취약층 식별 및 제약요인 파악, 수요 우선반영, 분리데이터 모니터링 등의 조치가 이루어졌으며, 실제 소외계층을 고려한 정성적, 정량적 사업성과 달성이 확인됨.

기 준	핵심 질문	점수 구분	참고사항
4. 효 율 성	· 사업은 경제적이고 시의적절한 방식으로 추진되었는가?	1	별도 타당한 사유 없이 사업 기간 및 예산의 150% 이상이 비효율적으로 증액 및 연장됨.
		2	사업 기간 및 예산의 150% 이상이 증액 및 연장되었으나, 그 필요성 및 불가피성이 일부 인정됨.
		3	계획 대비 사업 기간 및 예산 활용에 소폭 조정사항(150% 미만)이 있으나, 그 필요성 및 불가피성이 인정됨.
		4	계획 대비 사업 기간 및 예산 활용에 소폭 조정사항(150% 미만)이 있으나, 그 필요성 및 불가피성이 인정되며, 총 예산 절감, 사업공기 단축, 추가 사업요소 반영 등 사업의 효율성에 긍정적인 영향이 확인됨.
	· 사업은 주요 투입 및 활동 간 균형, 상호작용을 고려하여 효율적으로 추진되었는가?	1	사업 주요 투입 및 활동 간 균형 및 상호작용을 고려하지 않아 사업 성과의 달성 미흡에 심각한 영향을 미침.
		2	사업 주요 투입 및 활동 간 균형을 별도로 고려하지 않았으나, 사업 성과에 유의미한 영향을 미치지 않음.
		3	사업 기획단계에서는 고려되지 않았으나, 추진단계에서의 필요에 의해 사업요소 간 순서 및 균형을 사후적으로 조정함.
		4	사업 기획단계부터 사업요소 간 균형 및 상호작용을 고려하였으며, 요소 간 시너지효과 및 연계성이 사업성과 강화요인으로 작용함.
5. 지 속 가 능 성	· 수원국 내 시스템, 조직 및 이해관계자는 사업 편익이 지속될 수 있는 재정적, 경제적 자립역량 및 위기대응능력을 갖추었는가?	1	수원국 내 사업에 참여하거나 인지하고 있는 인력이 확인되지 않으며, 예산계획 또한 불투명함. 발생가능한 위기에 대처할 수 있는 기제가 확인되지 않음.
		2	사업 성과 지속을 위한 수원국의 의지는 확인되나, 이를 위한 예산 및 인력확보계획이 구체적으로 마련되어 있지 않아 지속가능성을 담보하기 어려움.
		3	사업 성과 지속을 위한 일시(단년도) 예산을 확보하였거나, 일부 미흡하지만 빠른 시간내에 자체수익모델을 통한 자립운영이 가능할 것으로 판단됨. 평가팀에서 파악한 잠재적인 내·외부 위기사항에 대해 수원국 측에서 인지하고 조치방안을 마련하고 있으나 예산 및 인력 제약으로 인해 단기적으로 외부지원이 수반되어야 함
		4	사업 성과의 중장기 지속을 위한 다년도 예산을 확보하였거나 자체 수익모델로 재정적, 경제적 자립역량 확보가 충분히 가능함. 내·외부 위기상황 발생시 자체적으로 의사결정 및 대응한 사례가 존재하거나, 대응 가능한 인력 및 예산구조가 확보되었다고 판단됨.
	· 사업 편익이 장기적으로 지속될 수 있는 제도적, 사회적 환경이 갖추어졌는가?	1	사업 기획 및 추진 상의 미흡으로 성과 지속 및 확장이 불가능할 것으로 판단됨.
		2	현 시점에서의 사업 성과는 일정 부분 확인되나, 향후 사업 성과 지속 및 확장을 위한 별도 조치가 확인되지 않음.
		3	사업 성과 지속 및 확장을 위한 구체적인 조치(ex. 입법화, 사업 모델의 수원국 자체 프로그램 적용, 전담기관 지정 및 운영 등) 마련을 위한 구체적인 사전 준비 혹은 논의가 진행되고 있음.
		4	사업 성과 지속 및 확장을 위한 구체적인 조치(ex. 입법화, 사업 모델의 수원국 자체 프로그램 적용, 전담기관 지정 및 운영 등)이 실현됨.
6. 영 향 력	· 사업은 장기적이고 광범위한 관점에서 사회적, 환경적, 경제적으로 전환적 효과(transformative effect)를 달성하거나 달성할 가능성이 있는가?	1	해당 사업 추진 및 종료 후 관리 조치가 사업 효과의 지속 및 확산을 저해할 뿐만 아니라 수원국의 사회, 환경, 경제적 개선에 전혀 기여하지 못하거나 부정적 영향을 미칠 것으로 판단됨.
		2	평가 시점에서 사업 효과의 지속 유지 여부를 확인하기 어려우며, 사업으로 인한 사회, 환경, 경제적 변화를 확인하기 어려움.
		3	사업 효과의 즉각적이고 직접적인 효과가 지속되고 있으며, 이로인해 수원국의 장기적인 사회·환경·경제적 변화에 어느정도 기여할 수 있을 것으로 판단됨.
		4	사업종료 이후에도 직, 간접, 잠재적 사업성고가 지속적으로 확산 및 유지되어 수원국의 사회, 환경, 경제 전반의 패러다임 변화에 레버리지로 작용하였으며, 이러한 변화를 구체적인 사례로 검증할 수 있음.

표 5. 종료평가용 평가등급표

평가 기준	핵심 질문	점수		산정 이유
1. 적절성	· 사업은 이해관계자의 주요 정책 및 수요 (needs), 우선순위를 반영하여 설계 (design)되었는가?		/4점	
	· 내·외부 상황변화에 맞추어 사업 설계를 적절히 관리 및 유지하였는가?		/4점	
	적절성 평점(a)		/4점	
2. 일관성	· (내적 일관성) 한국 정부, 국내 타 기관, KOICA 타 사업, 주요 국제규범 및 기준과의 상호보완성, 조화/조율, 부가가치를 고려하여 사업을 추진했는가?		/4점	
	· (외적 일관성) 현지 내 타 주체(타 공여기관, 수원국 정부 및 민간분야)의 개입과 상호보완성, 조화 및 조율, 부가가치를 고려하여 사업을 추진했는가?		/4점	
	일관성 평점(b)		/4점	
3. 효과성	· 사업의 직접적, 일차적 산출물(output) 을 계획한대로 달성하였는가?		/4점	
	· 사업의 중장기 성과(outcome) 및 목표(goal) 를 달성하였거나 달성할 것으로 예상하는가?		/4점	
	· 해당 사업 사회적 소외계층을 포용하여 형평성있게 성과를 달성하였는가?		/4점	
	효과성 평점(c)		/4점	
4. 효율성	· 사업은 경제적이고 시의적절한 방식으로 추진되었는가?		/4점	
	· 사업은 주요 투입 및 활동 간 균형, 상호작용 을 고려하여 효율적으로 추진되었는가?		/4점	
	효율성 평점(d)		/4점	
5. 지속 가능성 (준비도)	· 수원국 내 시스템, 조직 및 이해관계자는 사업 편익이 지속될 수 있는 재정적, 경제적 자립역량 및 위기대응능력 을 갖추었는가?		/4점	
	· 사업 편익이 장기적으로 지속될 수 있는 제도적, 사회적 환경 이 갖추어졌는가?		/4점	
	지속가능성 준비도 평점(e)		/4점	
종합 점수 (a+b+c+d+e)				
종합 평가 등급		택1(매우 성공적, 성공적, 부분 성공적, 미흡)		
KOICA 평가등급		택1(A,B,C,D,E,F)		

※ 평가자는 회색 음영 부분만 작성하되, 주어진 평가표에 의거하여 종합 평가 등급과 점수를 모두 제시해야 함.



- **(적절성)** 개입(intervention)의 목표와 설계가 수혜자, 국제적, 국가별 및 개별 파트너와 기관의 수요와 정책 및 우선순위에 상응하며, 상황변화에도 지속적으로 부합하는 정도
 - **개입(intervention):** 개입은 평가 기준을 사용하여 평가할 수 있는 프로젝트, 프로그램, 정책, 전략, 주제 분야, 기술원조, 정책자문, 제도, 재정구조 등 모든 유형의 개발 및 인도주의적 노력을 포함함.
 - **설계(design):** 특정 개입(프로젝트, 프로그램 포함)의 설계는 사업 목표 설정, 변화이론(theory of change), 행위이론(theory of action) 및 이에 수반하는 이행 조치 마련, 리스크 및 맥락 분석 등 개입의 적절성과 우선순위/수요 부합성을 판단할 수 있는 사업품질정보를 포함함.
 - **사업 변화관리:** 이전의 적절성 평가가 정책 우선순위 부합여부에 대해 개입 설계단계에서 일회성으로 진행되었다면, 개정된 정의 하의 적절성 평가는 복잡하거나 변화하는 상황에 대한 적응과 대응을 위한 시간적 관점(time dimension)이 포함되어 사업 변화관리의 중요성을 강조하고 있음.
- **(일관성)** 한 국가, 부문 또는 기관 내에서 특정 개입의 다른 개입과의 양립 가능성
 - **내적 일관성:** 동일 정부·기관이 수행하는 특정 개입과 다른 개입 간의 시너지와 상호연계성, 해당 기관 또는 정부가 준수하는 관련 국제 규범, 기준 등과의 일관성을 의미
 - **외적 일관성:** 동일한 맥락 속에서 특정 개입과 다른 주체의 개입 간의 일관성을 고려함. 여기에는 상호보완성, 다른 개입과의 조화 및 조율, 해당 개입 간 중복방지 및 시너지효과를 통한 고부가가치화를 포함
- **(효과성)** 개입의 목표와 성과의 달성 정도 또는 예상되는 달성정도, 수혜그룹 간 차등적 성과 등을 포함
 - **형평성을 고려한 사업성과:** ‘누구도 소외되지 않는 개발원칙(leave no one behind)’에 의거, 평등(equity)이 개입의 목표로 설정되지 않았더라도 소외된 그룹에게 사업의 성과가 충분히 보장되었는지 검토 필요
- **(효율성)** 개입이 경제적이고 시의적절한 방식으로 성과를 달성하거나 달성할 가능성의 정도
 - **경제적이고 시의적절한 방식:** 경제적(economic) 방식이란 투입요소(자원, 전문성, 자원, 시간 등)가 산출물(output), 성과(outcomes)와 영향(impacts)으로 전환됨에 있어, 타 대안 대비 최대의 비용효율성을 달성하는 것을 의미함. 시의적절(timely)한 방식이란 계획된 기한 또는 변화하는 맥락 및 수요에 따라 합리적으로 조정된 기한 이내에 개입이 효율적으로 운영되었는지를 의미함
- **(영향력)** 긍정적 또는 부정적, 의도적 또는 비의도적인지와 별개로, 개입이 상위 차원의 효과를 달성하거나 달성시킬 것으로 예상되는 정도
 - **전환적 효과(transformative effect):** 영향력 평가에서 검토하는 전환적 효과는 효과성 평가에서 검토하는 직접적, 일차적 결과보다 더 장기적이고 광범위한 사회적, 환경적, 경제적 효과를 의미함. 즉 영향력 평가에서는 개입의 즉각적 성과뿐만 아니라 간접적, 이차적, 잠재적 성과를 살핌으로써 수원국 당면과제의 근본적 원인 해결에 집중함
- **(지속가능성)** 개입의 순 편익이 지속되거나 지속가능한 정도
 - **순 편익(net benefit):** 개입과 관련하여 지속적으로 소요되는 모든 비용을 고려했을 때, 개입 이후에도 지속되는 편익을 의미함. 순 편익 산출을 위해서는 개입과 관련한 잠재적 상충관계(trade-off)와 관계자 역량 및 시스템의 회복력(resilience)에 대한 분석이 필요함.

4. 평가 품질관리

□ 준용 기준

OECD DAC는 평가기획 및 시행단계에서 평가의 품질을 제고하기 위한 가이드라인 「개발평가 품질기준(Quality Standards for Development Evaluations)」을 제시하고, 평가의 독립성과 윤리를 고려해 평가를 수행함으로써 평가의 품질과 완전성을 높일 것을 권고한다. KOICA는 동 기준을 준용해 평가의 품질을 관리해오고 있다.

* OECD DAC은 2006년 개발평가 품질기준 초안을 발표하고, 3년간 회원국 및 기관들로부터 의견수렴 과정을 거쳐 2010년 동 기준을 확정했음

□ KOICA 평가 품질검토 제도(평가 품질검토위원회)

KOICA는 평가의 실질적 독립성 확보와 평가 품질관리 제고를 위해 「평가 품질관리 기준」(표 6)을 준용하여, 평가 완료 후 공공·학계·시민사회 등으로 구성된 외부 전문가(독립평가패널)를 통한 평가 품질검토 실시를 위해 평가 품질검토위원회를 구성·운영하고 있다.

표 6. 평가 품질관리 기준

품질관리 기준	평가 절차	세부 관리 항목
평가설계의 타당성	설계단계	· 평가이해관계자 파악 · 평가대상 분석 · 평가의 목적 및 범위 설정 · 평가 방법론 제시
평가수행의 일관성 및 투명성	수행단계	· 국내 문헌 및 자료 조사 · 현지조사 계획 및 수행 · 조사내용 분석 수행 · 평가자의 태도 및 윤리준수³⁾
평가결과의 신뢰성	결과보고단계	· 평가결과의 객관성 제시 · 평가제언의 유용성 검토 · 보고서 작성의 성실성

3) 관련 세부사항은 동 길라잡이의 18~19페이지 참고

□ 평가 품질관리 주체별 역할


평가소관부서는 평가에 필요한 주요문서 확보 및 검토 후 평가자에게 제공하고, 필요 시 평가주관부서에 종료평가 자문을 의뢰하고 그 결과를 반영한다. 평가주관부서는 사업 종료평가 표준화(가이드라인 및 양식), 평가품질 확보와 검토를 위한 외부전문가 그룹(독립평가패널)*을 운영한다.

* 공공·학계·시민사회 등 평가전문가 풀(임기 2년)에서 심사위원 3명을 실시마다 선정하여 종료평가 결과 품질 검토에 참여하며, 민간참여를 통한 평가정보 신뢰도 제고와 평가품질지수 관리 등 효과 기대

□ 평가 품질검토 절차

품질검토는 아래(표 7)와 같이 1개월 1회 정기 실시하며(필요시 탄력조정), 수요 확정 후 4주 이내에 후속조치까지 완료하는 것을 원칙으로 한다.

표 7. 평가 품질검토 절차



○ (수요 확정) 평가실은 평가가 완료된 사업을 매월 마지막 주 확인하여, 다음번 실시되는 평가 품질검토 대상*에 포함한다.

○ (검토 실시) 평가자의 정보를 패널위원에게 밝히지 않는 블라인드 검토를 원칙으로 하며, 패널위원은 평가결과물* 및 평가자가 참고했던 사업관련 필수문서**를 검토한다.

* (필수) 사업평가 결과보고서, 사업평가 등급 결과표, 사실관계 확인서, 환류과제 검토서

(선택) 분야 교훈 리포트, 환류과제(안), 그 외 평가 산출물

** 사업개요서, 집행계획서, 중간평가(점검)보고서, 사업수행기관의 종료보고서 등

○ (검토 결과) 패널위원별 품질검토 결과를 종합하여, 최종 품질등급(A~D)을 부여하고 품질통과 여부(Pass/Non-Pass)를 판정한다(표 9). A-C등급은 Pass, D등급은 Non-Pass로 처리된다. D등급의 경우, 평가자 희망 시 1회에 한해 1개월 이내 보완 후 재심 가능하다.

○ (결과 후속조치) 평가결과물을 접수한 후 6개월 이내에 피평가부서에 확정된 품질검토 결과를 통지한다.

- (D등급 평가 후속조치) 최종적으로 평가품질 미흡(D등급)으로 분류된 평가보고서는 평가를 통해 도출된 사업 평가등급을 무효처리 및 삭제한 뒤, 보고서 본문 내 평가 품질등급 판정 결과를 포함하여 대외공개한다.
- (우수 평가자 선정) 최종 품질등급이 A등급인 평가를 수행한 평가책임자를 후보군으로 우수 평가자를 선정한다.

그림 1. 보고서 품질검토 및 후속조치 과정

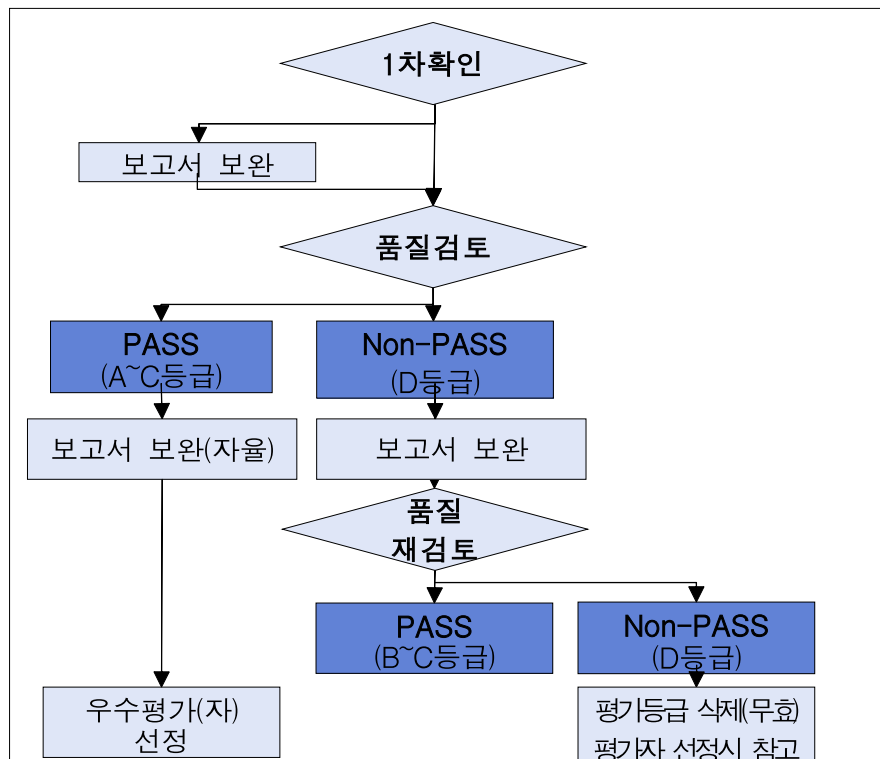


표 8. 평가 품질검토 기준 및 항목

부문별 기준 (배점)	세부항목 (배점)	비고
I. 평가 설계 및 방법론 (20)	· 평가 상황 및 맥락 분석의 적절성 (10) · 평가 설계 및 방법론의 엄밀성 (10)	독립평가패널 (패널위원) 100% 배점
II. 데이터의 신뢰성 (20)	· 데이터 수집 과정 및 데이터 질 (20)	
III. 분석 및 평가 결과 (25)	· 적절한 분석 및 평가 결과의 신뢰성 (30)	
IV. 결론 (20)	· 결론·제언의 타당성 (20)	
V. 보고서 구조 및 형식(10)	· 보고서 요약 및 구조의 명확성 (20)	

표 9. 최종 품질등급*

최종 품질등급	정의	검토 결과
A(우수)	· 최종점수 90점이상	평가 품질 기준 부합 (Pass)
B(양호)	· 최종점수 80점이상 90점미만	
C(보통)	· 최종점수 70점이상 80점미만	
D(미흡)	· 최종점수 70점미만	평가 품질 기준 미부합 (Non-Pass)

* 최종점수(각 패널위원의 종합점수의 평균)에 따라 등급을 부여

표 10. 평가 품질검토 결과표

평가명	000사업(사업기간/사업비) 평가		
품질검토 실시일	20xx년 xx월 xx일	패널위원	홍길동
품질검토 기준		구분	
I. 평가 설계 및 방법론		부문별 점수	xx점
평가 배경 및 맥락 분석의 적절성			xx점
1. 평가 대상을 적절히 기술하였는가? - 사업(개입)에 대한 설명이 명확하고, 지역, 일정, 예산, 이행 상태, 수혜자의 수요 및 상황, 개입 맥락 등을 포함하여 기술하였는가? - 주요 이해관계자와 그들의 협력관계, 기여가 명확히 식별되는가? 2. 평가대상 사업의 PDM 또는 변화이론을 기반으로 평가가 설계되었는가? - 산출물과 결과물 간의 인과관계를 내려티브나 그래픽 형태로 제공하였는가? - 사업의 PDM 또는 변화이론을 점검 및 평가하고 필요시 재구성 하였는가?		☐ 우수 (10점) ☐ 양호 (8점) ☐ 다소 미흡(6점) ☐ 미흡 (4점)	(패널위원 의견작성)
평가 설계 및 방법론의 엄밀성			xx점
3. 평가 목적 및 사업 특성에 적합한 평가 기준과 질문을 사용하는가? 4. 평가 매트릭스에 평가 질문 외에도 측정 지표, 자료출처, 분석 방법, 표본추출 방법 등이 설정되었는가? 5. (성평등, 인권, 환경 정책마커 1, 2 해당 시) 해당 범분야 이슈 평가에 적합한 설계 및 방법론을 사용하였는가? 6. 평가 방법론의 한계를 인정하고, 이것이 평가 결과에 미칠 수 있는 영향을 기술하였는가? (이런 바이어스(bias)를 어떻게 극복할 수 있는지 논하였는가?)		☐ 우수 (10점) ☐ 양호 (8점) ☐ 다소 미흡(6점) ☐ 미흡 (4점)	(패널위원 의견작성)
II. 데이터의 신뢰성		부문별 점수	xx점
데이터 수집 과정 및 데이터 질			xx점
7. 데이터 수집, 분석, 표본추출 방법이 적절히 제시되었는가? 8. 객관성, 신뢰성, 유효성을 갖춘 데이터를 사용하고, 데이터 출처를 명확하게 기재하였는가? 9. 평가 과정에서 차별이나 기타 윤리적 사항 등 민감성에 유의하며 인권 기반접근방식(HRBA)에 기반하여 데이터를 수집하였는가?		☐ 우수 (10점) ☐ 양호 (8점) ☐ 다소 미흡 (6점) ☐ 미흡 (4점)	(패널위원 의견작성)
10. 수집된 질적, 양적 데이터를 적절하게 교차 검증 하였는가?		☐ 우수 (10점)	

- (국제기구협력사업의 경우) 협력기구의 협조 하에 필요한 데이터를 충분히 수집하고, 이를 교차 검증할 수 있는 보완 조사를 충실히 실시하였는가? - ‘사업성과달성도’를 교차 검증할 수 있는 데이터를 적절히 설정하였는가?		☐ 양호 (8점) ☐ 다소 미흡 (6점) ☐ 미흡 (4점)	
III. 분석 및 평가 결과		부문별 점수	xx점
적절한 분석 및 평가결과의 신뢰성			xx점
11. 정확한 양적 질적 분석을 통해 평가 결과를 도출하였는가? 12. 평가 결과를 뒷받침할 수 있는 구체적인 근거(개인적인 진술, 전해들은 말, 사람들의 의견 모임을 제외한 사실 또는 데이터)를 제시하였는가? - (국제기구협력사업의 경우) 국제기구 측에서 작성한 결과보고서 혹은 평가보고서와 별개로 KOICA 측 평가자의 판단 및 전문성에 기반하여 평가 내용이 제시되었는가?	☐ 우수 (10점) ☐ 양호 (8점) ☐ 다소 미흡 (6점) ☐ 미흡 (4점)	(패널위원 의견작성)	
13. ‘사업성과달성도’를 객관적이고 신뢰할만한 다양한 수단을 통해 재검증하였는가?	☐ 우수 (10점) ☐ 양호 (8점) ☐ 다소 미흡 (6점) ☐ 미흡 (4점)		
14. 모든 평가 질문에 대해 분석과 답변이 이루어졌는가? 15. 사업 논리모형의 작동 또는 비작동으로 이어지는 인과적 요인(상황적, 조직적, 관리적 측면 등)을 명확히 확인하고 기술하였는가?	☐ 우수 (10점) ☐ 양호 (8점) ☐ 다소 미흡 (6점) ☐ 미흡 (4점)		
IV. 결론 및 제언		부문별 점수	xx점
평가 결론 · 환류과제의 타당성			xx점
16. 결론은 평가자의 편견 없이 평가 결과의 명확한 흐름을 통해 도출되었는가? 17. 단순 평가 결과 이상의 결론이 도출되었으며, 평가 대상사업 저변의 문제들에 대해 완전한 이해를 제공하는가? 18. 최종 산정된 평가 등급은 본문 내 평가 내용과 일치하는가?	☐ 우수 (10점) ☐ 양호 (8점) ☐ 다소 미흡 (6점) ☐ 미흡 (4점)	(패널위원 의견작성)	
19. 교훈과 환류과제는 평가 결과를 통해 상호 중복없이 논리적이고 명확하게 도출되었는가? 20. 환류과제는 이해관계자 그룹별로 조치가 가능하며(action-oriented), 현실적이며, 구체적으로 작성되었는가?	☐ 우수 (10점) ☐ 양호 (8점) ☐ 다소 미흡 (6점) ☐ 미흡 (4점)		
V. 보고서 구조 및 형식		부문별 점수	xx점
보고서 요약 및 구조의 명확성			xx점
21. 보고서 요약은 의사결정에 유용한 단독문서로서 적절한 간결성과 깊이가 있으며, 평가를 이해하는데 필요한 정보를 포함하고 있는가? 22. 보고서 구성*이 논리적이며, 보고서의 분량은 적당인가?(첨부분서를 제외한 본 보고서 분량 40쪽 이내) * 목차 및 약어, 평가 개요, 성과달성도, 기준별 평가 결과, 결론, 교훈 및 환류과제 23. 보고서에는 문법적 오류, 오타자, 문장부호 오류 등이 없어 읽고 이해하기 쉬운가?(보고서의 주 대상 독자에게 적합한 언어로 작성되었는가?) 24. 첨부에는 평가결과 국영문 요약, 현지조사 개요, 일별활동내역, 면담자 목록 및 주요 면담질문, 설문조사지 및 설문조사 결과, 참고문헌 목록 등이 포함되었는가?	☐ 우수 (10점) ☐ 양호 (8점) ☐ 다소 미흡 (6점) ☐ 미흡 (4점)	(패널위원 의견작성)	
종합 점수	xx점		
품질검토 총평	(패널위원 의견작성: 감점요인 및 개선 필요사항 위주로 작성)		

□ 평가용역 종합등급

입찰을 통해 선정된 평가 용역업체의 경우, 평가 산출물의 종합적인 품질검토를 위해 평가 용역 종합등급을 추가로 판정한다. 해당 등급은 KOICA가 추후 유사 평가를 추진할 시 고려될 수 있다.

표 11. 평가용역 종합등급 산정 기준 및 항목

부문별 기준(배점)	세부 기준	검토 결과
보고서 품질 일관성 (평가책임자 역량) (50점)	· 용역의 개별 평가보고서가 적정 수준 이상의 구조적 일관성 및 품질 일관성을 갖추었는가? ※ 단 1개 이상의 개별 사업 평가품질등급이 D등급(Non-Pass)일 경우 무조건 미흡 판정	· 우수 : 50점 · 양호 : 40점 · 다소미흡 : 30점 · 미흡 : 20점
교훈리포트 품질 적절성 (20점)	· 개별 사업평가 결과에 기반하여 핵심적인 분야별 교훈을 선별하였는가? · 작성된 교훈 리포트는 국제개발협력 동향 및 분야별 전문지식을 적절히 반영하고 있는가? · 교훈리포트 활용 시 충분한 효과가 기대되는가?	· 우수 : 20점 · 양호 : 16점 · 다소미흡 : 12점 · 미흡 : 8점
환류과제 이행방안 적절성 (30점)	· 개별 사업평가 결과에 기반하여 즉시 환류가 필요한 핵심적인 과제를 선별하였는가? · 환류과제 이행방안 및 이행주체가 구체적이고 적절히 설정되었는가? · 환류과제 이행시 충분한 효과가 예상되는가?	· 우수 : 30점 · 양호 : 24점 · 다소미흡 : 18점 · 미흡 : 10점
총점 (100점)	· 최종점수에 따라 등급 부여	· A등급 : 90점 이상 ~ 100점 · B등급 : 80점 이상 ~ 89점 · C등급 : 70점 이상 ~ 79점 · D등급 : 70점 미만

5. 평가 윤리

□ KOICA 평가윤리 준수도 평가

KOICA는 「국제개발협력 평가윤리지침」에 근거해, 평가수행과정에서 불법행위 또는 비윤리적 행위 발생을 방지하기 위한 목적으로 평가윤리 준수도 평가를 실시하고 있다. 종료 평가 종료 후 평가자와 피평가자(평가소관부서 및 사무소)가 ‘평가 윤리 준수도’를 상호 평가하게 된다. 평가윤리 준수도 평가항목은 아래(표 12)와 같다.

표 12. 국제개발협력 평가윤리지침

평가윤리지침	주요내용
제2장 평가 수행원칙	• (독립성) 정책결정, 사업시행과정으로부터 독립된 평가를 수행해야 함 • (공정성) 다양한 이해관계자의 입장과 의견을 고려해 포괄적이고 균형적으로 평가, 공정하고 편견 없는 태도로 평가해야 함 • (신뢰성) 신뢰할 수 있는 객관적 자료와 관찰, 일관성 있는 방법론, 분석방법과 절차에 근거해 평가를 수행해야 함 • (책무성) 계획된 일정과 예산범위 내에서 평가를 완수해야 하며, 평가예산 지출관련 투명하게 기록 및 관리해야 함 • (정확성) 평가대상의 목적과 내용에 대해 정확하게 기술하고 적절한 평가방법론을 채택하고, 다각적 방법으로 철저한 조사를 수행해야 함 • (완결성) 평가대상의 강점이 강화되고 문제점이 밝혀질 수 있도록 강점, 약점을 기록함으로써 완결적이고 공정한 평가를 수행해야 함 • (투명성) 평가목적, 기준, 결과 활용 등을 이해관계자에게 명확히 알려야 함
제3장 평가참여자 보호	• (평가참여자에 대한 배려) 평가수행과정에서 다양한 문화, 언어, 현지관습, 종교적 신념, 성별에 따른 역할, 장애, 연령, 인종 등 차이를 존중하고 각 문화 및 환경에 적합한 평가도구를 사용해야 함 • (익명성 보장) 평가참여자의 익명성 보장의 범위와 한계에 대해 알리고, 익명성 유지를 위해 노력해야 함 • (부정적 영향의 최소화) 평가대상 또는 평가참여자에게 부정적 영향을 최소화하도록 노력해야 함
제6장 평가윤리 준수	• 평가수행과정에서 불법행위 또는 비윤리적 행위가 발생되었다고 의심되거나 보고받은 경우, 이에 대한 조사를 실시하고 적절한 조치를 취해야 함

표 13. 평가윤리 준수도 평가항목

평가대상	평가주체	평가항목
피평가자 (사업관리부서 · 사무소)	평가자	· 평가자에게 평가에 필요한 주요문서 및 관련 자료 제공 여부 · 평가자에게 평가결과등급 등 강요 여부 · 평가자에게 특정 질문 또는 지표 제외 강요 여부 · 그 외 평가자의 독립성과 객관성에 영향을 줄 수 있는 개입 여부 예) 불가피한 경우를 제외한 평가자 일정 동행, 수혜자 인터뷰 개입, 객관적인 사실관계 수정 범위를 벗어난 평가 결과 조정 요구, 대가성 여부를 불문한 금품, 식사 제공 등
평가자	피평가자 (사업관리부서 · 사무소)	· 평가 수행의 성실성 및 정직성 여부 · 사업 관련 이해관계자의 문화, 관습, 종교적 신념 등 존중 여부 · 평가 수행 시, 개인정보, 초상권 보호 등 인권침해 예방 노력 여부 · 평가 수행 시, 성주류화, 인종, 성별, 언어 등 차이 고려 여부 · 피평가자의 의견 경청 및 존중 여부 · 사업평가 시 추가사업형성 등 평가 외의 업무 추가 시도 여부 (KOICA 후속사업계획이 이미 존재하여 별도 요청이 있었을 경우 제외) · 사전 승인 없이 평가설문에 사적 목적 문항 포함이나 이중 설문조사 포함 여부
평가자	평가소관부서	· 평가 수행 시, 개인 연구용 데이터 수집⁴⁾ 여부 · 평가자 개인 연구 목적의 평가 결과 활용 시 KOICA의 사전 승인⁵⁾ 여부

출처 : 「Quality Standards for Development Evaluation」 OECD DAC 2010, 「개발협력프로그램평가의 설계와 실행」 World Bank Group 2009 등 참고하여 재구성

□ 평가윤리 준수도 평가결과 활용계획

KOICA는 평가자(평가책임자) 별 평가 윤리 준수도 평가 결과를 축적하여, 추후 평가자 선정 시 해당 평가 결과를 참조한다. 피평가자(평가소관부서 및 사무소)의 경우, 평가윤리 준수도 평가 결과에 따라 향후 평가조달 업무 시 참고하거나 별도 교육 등 조치를 취할 수 있다.

□ 주의사항

평가자가 대상사업의 예비·기획조사, 집행계획수립, 사업실시 등에 참여한 경우에 평가수행 불가하며⁶⁾, 평가에 참여하려는 자는 평가투입인력 참여자격 확인서를 제출해야 한다. 단, 사업 관련 자문, 심사, 검토 등 일회성 외부인력으로 사업에 참여한 경우는 평가 수행이 가능하다. 또한 KOICA 본부 및 사무소(이해관계자)의 예산으로 평가자-본부 및 사무소 간 오찬 및 만찬⁷⁾은 금지한다.

4) 평가용 설문지에 목적 및 용도 기재하여, 조사 대상자 이해도 제고하며, 이중 설문조사 금지

5) 제안요청서 및 계약서 상 '보고서 저작권 한국국제협력단' 명시하고, 논문·보고서 등 게재 시, 'KOICA 지원으로 평가가 수행되고, 관련 데이터 수집됨'을 명시(세부 문구 및 준수사항은 「조사연구사업 규정」 제43조의4 참고)

6) 관련 「사업평가 규정」 제13조(평가자 선정)의 3

II. 종료평가 업무수행 절차

KOICA 종료평가 업무 절차는 **평가기획-평가실시-평가결과 제출-평가환류**로 구분된다(표 14).

표 14. 종료평가 세부절차

평가단계		세부절차	
평가기획	종료평가 추진계획 준비	KOICA	· 종료평가대상사업 조사 및 평가위원회 의결, 최종 확정 · 종료평가대상사업 주요문서 수집 및 검토
	↓	KOICA	· 종료평가 추진계획 수립
	↓	KOICA	· (내부평가) 내부평가 운영 기준에 따른 KOICA 직원 선정 · (외부전문가 선정 시) 공모 및 위촉 · (외부기관 선정 시) 조달 및 입찰
	↓	평가자 KOICA	· 종료평가 수행계획서 작성 후 제출, 착수보고회 실시 · 종료평가 수행계획서 검토 결과 및 착수보고회 의견 반영 · 종료평가 수행계획서 검토, 착수보고회 참석 및 의견 제시
평가실시	↓	평가자 KOICA	· 국내조사 실시 : 문헌조사, 인터뷰 등 · 현지조사 준비 : 현지조사 계획서 수립 등 · 현지조사 계획서 및 결과보고서 제출 · 현지조사 지원
	↓	평가자 KOICA	· 중간보고서 제출 및 중간보고회 실시 · 중간보고회 참여, 의견 공유
	↓	평가자 KOICA	· 평가 최종점검회 실시 · 환류과제검토서 및 사실관계확인서 초안 작성 및 공유 · 최종점검회 참여, 의견 공유
	↓	평가자 KOICA	· 종료평가 표준결과물 제출 · 종료평가 표준결과물 접수 및 결과보고 · 평가윤리 준수도 평가 참여 · 환류과제검토서 및 사실관계확인서 최종안 작성
평가결과제출	↓	KOICA 평가자	· 평가 품질검토위원회(독립평가패널) 운영 · 평가 품질검토위원회 의견 자율 반영
	↓	평가자 KOICA	· 수원국 환류워크숍 실시 · 수원국 환류워크숍 의사 확인 및 일정 조율, 워크숍 참여, 의견 공유
	↓	KOICA	· 사업별 평가결과에 따라 사업종료 또는 사후관리 등 의사결정 · 사업평가 결과 도출된 환류과제 검토 및 이행 · 보고서 편집 및 웹페이지 공개 · 평가결과물 및 품질검토 결과 종합분석 · 이해관계자별 맞춤 형태로 평가 종합분석 결과 정보 공유
	↓	KOICA	· 사업별 평가결과에 따라 사업종료 또는 사후관리 등 의사결정 · 사업평가 결과 도출된 환류과제 검토 및 이행 · 보고서 편집 및 웹페이지 공개 · 평가결과물 및 품질검토 결과 종합분석 · 이해관계자별 맞춤 형태로 평가 종합분석 결과 정보 공유
평가환류	↓	KOICA	· 사업별 평가결과에 따라 사업종료 또는 사후관리 등 의사결정 · 사업평가 결과 도출된 환류과제 검토 및 이행 · 보고서 편집 및 웹페이지 공개 · 평가결과물 및 품질검토 결과 종합분석 · 이해관계자별 맞춤 형태로 평가 종합분석 결과 정보 공유
	↓	KOICA	· 사업별 평가결과에 따라 사업종료 또는 사후관리 등 의사결정 · 사업평가 결과 도출된 환류과제 검토 및 이행 · 보고서 편집 및 웹페이지 공개 · 평가결과물 및 품질검토 결과 종합분석 · 이해관계자별 맞춤 형태로 평가 종합분석 결과 정보 공유

7) 평가자-본부 및 사무소 간 오찬 및 만찬의 경우, 평가 예산 내 식비(체재비)로 처리

1. 종료평가 기획

1) 종료평가 추진계획 수립

□ 평가소관부서의 평가 추진계획 수립

평가성사정 검토 및 평가위원회 심의를 통해 평가대상사업 확정 이후 KOICA 평가소관 부서 담당자는 평가계획 수립에 필요한 주요문서(표 15)를 확보하고 검토한 후, 이를 바탕으로 다음과 같은 사항을 포함하여 평가계획을 작성한다.

- 평가 개요(평가 목적, 목적 및 범위, 추진일정)
- 평가 대상사업 개요(추진 배경, 사업내용)
- 평가 추진계획(수행방법, 추진체계, 추진일정, 평가자 선정방법)

종료평가는 원칙적으로 문헌분석과 함께 현지조사 통한 국내외 이해관계자 면담을 필수로 포함한다. 단, 코로나 등으로 물리적 현장방문이 불가한 경우, 화상회의 통한 현지 이해관계자 면담 실시와 건축물/기자재 동영상자료(사무소 및 수원기관 촬영) 검토로 대체 가능하다. 또한 평가는 시행주체에 따라, 내부평가⁸⁾, 외부평가, 공동평가⁹⁾ 등 다양한 방식¹⁰⁾으로 수행될 수 있다.

8) 내부평가는 원칙적으로 종료평가 대상사업과 이해관계가 없는 타부서(지역)의 내부직원으로 평가자를 선정하여(필요시 외부전문가 자문그룹 구성 가능) 평가하는 것을 말한다.

9) 공동평가는 국제기구, 공여기관 등 국내외 타 기관과의 공동평가를 말한다.

10) 본 길라잡이는 외부 평가용역 선정을 통한 평가수행 방식에 중점을 두어 설명하고 있으며, 외부평가 시 평가기획 단계는 외부평가 수행업체 선정 및 계약 완료까지를 의미한다.

표 15. 종료평가 기획 시 확인 필요한 주요문서

구 분	주요문서
필수	· CPS(없는 경우 CAS 등 국별 정책자료) · 분야별 전략(교육,보건,농촌개발,공공행정,환경주류화,성주류화 등) · 사업개요서, 사업요청서(PCP) · 예비·기획조사 결과보고서 · Record of Discussion · 집행계획(PDM 포함) · 사업수행업체 사업수행계획서, 정기 모니터링보고서 · 집행계획에 명시된 각 활동별 산출물의 결과보고서 (예) 초청연수결과보고서(설문결과 포함), 기자재지원 보고서(기자재 리스트 포함) · 중간평가, 연차점검 보고서 · 대상 사업수행(파트너) 기관의 사업종료보고서 · KOICA 사무소 종료보고 문서
선택	· 유사사업 평가보고서 · 수원국참여형평가 결과 · 그 외 필요에 따라 평가자에게 제공 가능한 참고자료

□ 평가팀 구성

평가팀은 평가일반, 분야, 국가 전문성을 보유한 전문가들로 역할을 분담하여 구성하되, 평가대상사업이 범분야이슈(성평등, 인권,환경) 정책마커 1(간접목적) 혹은 2(직접목적)에 해당하는 경우 해당분야 전문가를 평가팀에 포함할 것을 권고한다.

▲평가대상사업 수행기관에 현재 소속된 인력, ▲평가대상사업을 수행*한 투입인력(평가대상사업 수행용역 선정시 정량평가대상), ▲평가대상사업을 수행한 사업 담당자 및 결재권자(KOICA 퇴직자 포함)인 경우, 평가에 참여할 수 없다.

* 예비조사, 기획조사, 집행계획수립, 사업실시 등

2) 종료평가 수행계획서 작성 및 제출

□ 평가 수행계획서 작성

평가자 선정 행정절차 완료(계약체결 또는 내부결재 완료) 이후에 평가소관부서와 평가자는 함께 상세 평가 범위, 평가매트릭스, 평가방법, 현지조사 및 보고서 제출일정 등을 세부적으로 조정·확정한다. 종료평가 수행계획서 작성을 위해 평가 의뢰자(KOICA 평가소관부서)와 평가자 간 의사소통이 가장 중요한 시기이며, 평가수행의 전 과정 중 가장 중요하고 핵심적인 단계이다.

평가소관부서와 평가자는 수행계획서 작성 단계에서 최소 1차례 대면회의를 실시하고, 종료평가 수행계획 단계에서 평가에서 필수적으로 검토·활용되어야 하는 주요문서(표 15)를 상호 확인한다. 평가자는 평가소관부서에서 전달받은 평가대상 문헌과 목록을 점검하고, 최종적인 평가프레임워크(Evaluation Framework)와 계획을 확정하기 전 여러 이해관계자의 의견을 취합한다.



종료평가 수행계획 시 참고자료

- 해당 평가 제안요청서 및 기술협상의견서
- 「사업평가 규정」 (2023.08.)
- 「KOICA 프로젝트 기획, 모니터링 및 평가방법론」 (2009.11.)
- 「개발협력프로그램평가의 설계와 실행」
- 기타 사업부서 참고자료, 평가정보공개플랫폼 게시자료

□ 평가 수행계획서 제출

평가자는 수행계획서를 작성하고(표 16), 아래 시점에 평가소관부서에 제출한다.

- (내부평가) 종료평가 추진계획 내부결재 승인받고 2주 이내
- (외부전문가) 공모계약 후 2주이내
- (외부기관) 계약체결 후 2주이내

표 16. 평가 수행계획서 목차 및 세부 구성

목 차	세부 구성
I. 평가 수행개요	1. 평가 대상 2. 평가 목적 및 범위 3. 평가 추진일정 4. 평가 투입인력
II. 평가 세부실행방안	1. 단계별 평가 방법 2. 평가항목 및 평가 매트릭스 3. 국내조사 방법 및 계획 4. 설문조사 수행 계획 5. 현지조사 방법 및 계획 6. 평가결과 분석 방법 및 계획
III. 평가 품질관리방안	평가팀 자체 작성

☞ 주의사항

- 피평가자는 평가자에서 별도의 ePDM 작성을 요청할 수 없다, 다만, 평가자가 관련 성과 데이터 확보 가능성, 성과지표 준위 및 대표성 등의 사유로 ePDM이 반드시 필요하다고 판단하는 경우 평가수행계획서 상에 해당 사유와 ePDM(안)을 제시하고 평가자 책임 하에 활용할 수 있다. 해당 내용은 착수보고 이전에 반영되어 착수 보고 시 평가주관부서 및 피평가부서와 논의를 거쳐야 한다.
- ePDM 구성 및 평가 활용 시, 보고서 상에 아래 문구 삽입 필수
 “「KOICA 사업평가 길라잡이」를 준용, 평가팀은 평가보고서 품질 제고를 위해 평가팀의 책임하에 평가 대상 사업의 평가용 PDM을 재구성해 활용하였음.”

평가팀은 수행계획서 제출 시 OECD DAC 6대 평가범주별 △평가 질문, △측정지표, △자료출처, △분석방법을 포함한 평가매트릭스를 작성해야 한다. 각 평가팀은 표 17의 평가범주 정의 및 유의사항을 고려하여 평가매트릭스를 구성하되, 사업 특성과 맥락에 특화된 질문을 포함하도록 노력해야 하며 본문 내에서 모든 평가 질문에 충분히 응답할 수 있도록 적절한 수의 질문을 선정하여야 한다.

표 17. OECD DAC 6대 평가범주 정의 및 유의사항

평가범주	정의/핵심질문/평가 유의사항
적절성 (relevance)	· (정의) 해당 사업은 올바른 개입이었는가: 즉, 평가대상사업의 목표와 설계가 수혜자 그룹, 국제사회, 국가(수원국, 공여국), 파트너, 유관기관의 수요와 정책, 우선순위와 부합하였는지를 확인하며, 특히 상황변화에 맞추어 부합도를 유지하였는지 점검 · (원문) Is the intervention doing the right things: the extent to which the intervention's objectives and design respond to beneficiaries' global, country and partner/institution needs, policies and priorities, and continue to do so if circumstances change. <핵심 질문> 1. 사업은 이해관계자의 수요(needs)와 우선순위를 반영하여 설계되었는가? 2. 내외부 상황변화에 맞추어 사업설계를 적절히 관리 및 유지하였는가(ex. 코로나 19 영향 확인)? 3. (파트너십사업 해당) 해당 기구(기관)의 전문성, 사업 구성, 현지 환경 등을 고려할 때 해당 사업을 파트너십사업으로 추진하는 것이 적절하였는가? 4. (후속단계 사업 해당) 이전사업 추진계획, 범위 및 성과를 고려하여 후속단계 사업을 설계하였는가? · ‘적절성’ 평가 시 유의사항 1) 수요, 정책 및 우선순위 부합 여부 - 직·간접수혜자를 모두 아우르는 수혜자 분석범위 설정; - 국가에서 발표한 정책 내용과 사업의 연계성을 기계적으로 검증하는 것이 아닌, 대상 지역 내 취약계층의 가장 큰 수요를 반영하는지 확인; - 다양한 사업 이해관계자(중앙·지방정부, 시민사회단체, 민간기업, 국제기구 등)의 우선순위 및 전략 부합도, 이해관계자 그룹 간 잠재적 긴장·상충관계 파악 2) 대상 지역 내 경제·사회·문화적 맥락 반영 여부 - 사업기획 단계에서의 지역 내 맥락 반영뿐만 아니라, 사업 착수 이후 해당 맥락의 변화에 대해서도

평가범주	정의/핵심질문/평가 유의사항
	민감하게 반영하였는지 함께 확인; - 이전 유사 사업이 존재할 경우, 과거 대비 사업의 주요 가정사항, 이해관계, 우선순위 등이 어떻게 변화하였으며, 이전 사업 수행이 현재 평가대상사업의 추진 및 주요성과 달성에 미친 영향 확인 3) 사업설계의 품질 - 명확한 사업목표, 우선순위, 수요가 변화이론(ToC), 행동이론(ToA) 등을 통해 사업 설계상에 내재화되어있는지를 확인하고, 사업의 기술적, 조직적, 재정적 타당성 재확인 4) 사업 기간 내 변화관리 - 분쟁 발생, 정치·경제적 맥락 변화 등 기획단계에서 예기치 못한 내·외부 상황변화에 따른 개입의 적절성 유지, 위기관리 및 기회 창출 여부 확인
일관성 (coherence)	· (정의) 해당 사업은 얼마나 알맞은 개입이었는가: 즉, 한 국가, 부문 또는 기관 내에서 평가대상사업과 다른 개입 간의 양립 가능성을 의미하며, 내적 일관성과 외적 일관성으로 나누어 평가 · (원문) How well does the intervention fit: the compatibility of the intervention with other interventions in a country, sector or institution. <핵심 질문> 1. 한국 정부, 국내 타기관 KOICA의 타 사업과 상호보완성, 조화 및 조율, 부가가치를 고려하여 사업을 추진하였는가? 2. 대상 지역 내 타 주체(타 공여기관, 민간분야, 수원국 정부 등) 개입과의 상호보완성, 조화 및 조율, 부가가치를 고려하여 사업을 추진하였는가? 3. (국제기구사업 해당) 사업이 해당 국제기구가 자체 운영 및 관리하고 있는 플래그십 프로그램 혹은 공동 펀딩 사업의 일부라면, 관련 프로그램 내 타 사업과의 연계, 상호보완성, 원조조화, 성과 고도화 및 시너지효과 등을 고려하여 기획 및 추진되었는가? · ‘일관성’ 평가 시 유의사항 1) 내적 일관성(internal coherence) - 평가대상사업과 해당 공여기관 내 정책 프레임워크와의 부합도, 해당 공여기관에서 수행한 타 개입 활동과의 조화, 중복, 상호보완성 파악; - 특히 정책 일관성은 수평적, 수직적 관점으로 나누어 분석 및 평가할 수 있음. ※ 수평적 일관성: HDP Nexus, 국방정책, 범분야(젠더, 환경 등) 전략, 무역정책 등 ※ 수직적 일관성: 동일 국가 내 타 기관 및 조직(하위기관 포함) 정책 간 조화 2) 외적 일관성(external coherence) - 외부(국제) 정책 및 규범(SDGs 등)과의 부합도 확인; - 특정 맥락을 공유하는(동일 사업대상지역, 수혜자 그룹 등) 타 개입과의 조화, 중복, 부가가치 파악; - 사업설계 당시에 이미 존재했던 시스템 및 구조를 충분히 활용하여 협력구조를 구축하였는지 확인
효과성 (effectiveness)	· (정의) 해당 사업은 목표한 바를 달성하였는가: 즉, 평가대상사업의 목표와 성과의 달성 정도 또는 예상도, 그룹 간 차등적 성과 등을 평가 · (원문) Is the intervention achieving its objectives: the extent to which the intervention achieved, or is expected to achieve, its objectives and its results, including any differential results across groups. <핵심 질문> 1. 사업의 직접적, 일차적 결과를 계획한대로 달성하였거나 달성할 것으로 예상하는가? 2. 해당 사업은 사회적 소외계층을 포용하여 형평성있게 성과를 달성하였는가? 3. (국제기구사업 해당) KOICA 또는 한국 정부 지원의 가시성이 효과적으로 확보되었는가? · ‘효과성’ 평가 시 유의사항 1) 사업 목표 달성 - 사업 목적 및 성과가 명확하지 않은 경우, 평가자가 문헌조사, 이해관계자 인터뷰 등을 통해 사업 성과모형을 재정립하여 평가(ePDM 구성);

평가범주	정의/핵심질문/평가 유의사항
	- 평가 방법론은 어떻게 해당 결과가 도출되었는지 인과관계를 검증하고, 특정 성과의 달성, 부분 달성, 미달성 원인을 밝힐 수 있도록 설계; 2) 차등적 성과(differential results) 확인 - 사업 전 과정에서 취약계층의 수요, 장기적 변화, 불평등 해소를 고려하였는지 평가 3) 영향 요인 분석 - 사업성과 달성에 영향을 미치는 요인(작동요인/비작동요인)을 분석하여 제시 ex. 재정·경영관리, 인적자원, 규정 등 내부자원 관리, 사업계획 이행점검 및 산출물 품질점검 프로토콜, 사업 외적 맥락에 따른 변화관리 등
효율성 (efficiency)	· (정의) 해당 사업에 투입된 자원은 잘 활용되었는가: 즉, 평가대상사업이 경제적이고 시의적절한 방식으로 성과를 달성하거나 달성할 가능성의 정도를 평가 · (원문) How well are resources being used: the extent to which the intervention delivers, or is likely to deliver, results in an economic and timely way. <핵심 질문> 1. 사업은 경제적이고 시의적절한 방식으로 추진되었는가? 2. 사업은 주요 투입 및 활동간 균형, 상호작용을 고려하여 효율적으로 추진되었는가? 3. (파트너십사업 해당) KOICA-국제기구-NGO-기타 이해관계자 간 파트너십 및 커뮤니케이션은 효율적으로 관리되었는가? · ‘효율성’ 평가 시 유의사항 1) 경제 효율성 - 사업 투입 및 성과달성에 대한 비용 효율성뿐만 아니라 사업 추진으로 인해 발생한 이해상충관계를 종합적으로 고려하여 해당 사업의 경제성을 평가 2) 운영 효율성 - 최초 사업계획 내 자원배치 및 운영계획의 효율성 점검뿐만 아니라 맥락 변화 및 새로운 정보 개입을 고려한 투입자원 활용 효율성 확인 포함 3) 시의적절성 - 사업계획 당시 추진 일정의 현실성, 적절성과 함께 상황변화에 따른 일정 조율의 합리성을 함께 평가
지속가능성 (sustainability)	· (정의) 해당 사업의 편익은 유지될 것인가: 즉, 개입의 순 편익이 지속되거나 지속가능할 것으로 예상되는 정도 · (원문) Will the benefit last: the extent to which the net benefit of the intervention continue or are likely to continue. <핵심 질문> 1. 수원국 내 시스템, 조직 및 이해관계자는 사업의 순편익이 지속될 수 있는 재정적, 경제적 자립역량 및 위기대응능력을 갖추었는가? 2. 사업의 순편익이 지속될 수 있는 제도적, 사회적 환경이 갖춰졌는가? · ‘지속가능성’ 평가 시 유의사항 1) 지속가능한 환경(enabling environment) 조성 - 수원국 내 시스템, 조직, 이해관계자 역량 및 부정적 외부요인에 대한 회복력 강화 정도 평가 2) 두 가지 시점에서의 지속가능성 평가 - 사업 평가 시점에서 확인가능한 현재 지속가능성과 향후 달성할 것으로 전망되는 장기 지속가능성을 나누어 평가 3) 위험 및 이해상충관계 확인 - 재정적, 경제적, 사회적, 문화적 관점에서의 잠재적 위험요소 및 사업 성과 지속을 위한 추가 비용부담으로 인한 이해관계 상충요소 분석

평가범주	정의/핵심질문/평가 유의사항
취약계층, 인권	1. 사업 기획 시 지역의 취약계층(학교밖 아동, 장애인, 난민, 고아 등)을 식별하고, 그들의 차별적 수요 또는 소외/차별의 원인을 파악하고, 대응방안을 사업설계에 반영했는가? 만약 반영되지 않았다면, 향후 유사사업 추진 시 어떻게 사업설계에 반영되어야 하는가? 2. 취약계층의 사업참여 또는 관련 정보공유를 제한하는 요인을 사전에 파악하고 해결하려는 노력이 있었는가? 만약 그렇지 않았다면, 향후 유사사업 추진 시 어떠한 사전조치가 이루어져야 하는가? 3. 사업은 취약계층에 대한 차별의 유무를 파악하고 해결하려는 노력(사회경제적 그룹별 분리데이터 모니터링 등)을 통해 차별적 성과 (differential results)를 보장하는가?

□ 착수보고회 개최

평가자는 착수보고회를 통해 최종 평가수행계획과 국내조사 진전상황을 발표한다. 평가 착수보고 시 종료평가 수행계획서를 업데이트하여 작성하되, 평가대상사업 정보, 평가 추진계획 개요, 평가 주요 질문, 평가 주안 사항, 이해관계자 분석, 설문조사 계획, 현지 조사계획, 문헌조사 목록 등 세부 내용을 필수적으로 포함해야 한다.

표 18. 착수보고회 추진목적 및 주요 산출물

단계	추진 목적(주요 확인 사항)	주요 산출물
착수보고회	1) 평가 특이사항 및 중점사항 - 전·후단계 사업 분석, ePDM 활용 필요성 등 2) 면담이 필요한 이해관계자 3) 조사가 필요한 사항 4) 현지 조사 일정 5) 설문조사 방안 및 설문조사 대상 6) 추가 분석 필요한 문헌 등을 확인	평가 주요 질문 평가 주안 사항 이해관계자 분석 설문대상 및 설문 주요 사항 현지조사 계획 문헌조사 목록

2. 종료평가 실시

1) 국내조사 실시 및 현지조사 준비

국내조사는 문헌조사, 국내 이해관계자 면담 등을 통해 평가 대상에 대한 정보를 수집하여 평가 대상을 이해하고, 평가질문을 완성하는 단계이다. 국내조사는 현지 조사의 사전 단계로서, 충실한 현지조사 수행을 위한 사전계획 수립을 포함한다.

국내조사는 1) 평가대상 파악 및 평가 추진여건 확인, 2) 기초자료 수집 및 분석, 3) 조사내용 정리 등을 포함한다.

표 19. 국내조사 수행절차



Tip 국내조사와 현지조사 실시

- 국내조사의 분석 결과를 토대로 현지조사 계획을 수립한다.
- 국내조사에서 확인하기 어렵거나, 미진한 부분은 현지조사를 통해 보완한다.
- 국내조사를 단순히 현지조사 준비과정으로 생각하고, 실질적인 평가를 현지조사에서 시작할 경우, 현지조사가 현지 "답사"에 그칠 위험이 크므로, 체계적이고 실효성 있는 국내조사 수행이 필요하다.

□ 1단계 : 자료수집

문헌조사, 인터뷰, 설문조사 등은 대표적인 자료수집 방법이다.

○ 이해관계자 분석

올바른 이해관계자 파악은 정보 출처를 파악하는데 도움이 된다. 이해관계자를 파악할 때에는 국내, 국외로 구분하여 작성하는 것이 주요관계자의 누락을 방지할 수 있다.

표 20. 이해관계자 분류 예시

국 내	국 외
KOICA (본부 사업부서 이전·현재 담당자)	KOICA 해외사무소
사업수행기관 (PMC)	수원국 원조총괄기관
건축관리자 (CM)	수원국 수원기관
파견 전문가 등	직접수혜자

○ 문헌조사

문헌조사는 기록된 사실을 수집하기 위한 과정이며, 기록되지 않은 정보나 확인이 필요한 사항에 대해서는 관계자 인터뷰나 설문 등을 통해 정보를 수집할 수 있다. 문헌조사 대상 목록을 작성할 때는 평가의 목적과 질문을 상기하고, 이에 대한 답을 찾기 위해 필요한 정보가 무엇인지 질문하는 것에서 출발하면 더욱 수월하다.

문헌조사대상 목록을 작성 시에는 자료 수준별로 구분하여 작성한다. 문서의 성격에 따라 ▲1차: KOICA 관련 내부 문서, ▲2차: 수원국 문서(국가개발전략 등)로 구분할 수 있다. 외교전문 등 기밀자료를 전달할 경우에는 평가소관부서 담당자의 안내에 따라 필요시 제공문서 목록 및 정보보안 서약서를 작성하도록 한다.

그림 2. 문헌조사 목록 작성 단계



○ 인터뷰

인터뷰 실시 절차는 아래(그림 3)와 같다.

그림 3. 인터뷰 실시 절차



평가자는 인터뷰 섭외, 실시 등을 독립적으로 실시하되, 연락처 확보 등에 어려움이 있을 경우, 인터뷰 섭외를 위해 기관 간 요청이 필요할 경우 등에는 평가소관부서 담당자에게 도움을 요청할 수 있다.

직접 인터뷰가 어려울 경우, 이메일, 전화 등을 통한 서면 인터뷰로 대체할 수 있다. 직접 인터뷰 시에는 가급적 2명이 동행하여 인터뷰 진행, 기록 등 업무를 분담하도록 한다. 단, 피평가자에게 해당 업무 분담을 요청하지 않는다.

필요 시 국내 이해관계자를 대상으로 집단 인터뷰를 실시할 수 있다. 인터뷰 시 작성된 기록물(인터뷰 일정, 녹취록 등) 중 평가에 핵심적인 내용은 최종보고서 내에 첨부한다.

Tip 인터뷰 수행

- 독립적인 입장에서 질문한다.
- 반구조화(Semi-structured)된 설문¹¹⁾문항을 구성하여, 인터뷰의 흐름에 따라 후속(Follow-up) 질문을 이어가도록 한다.
- 답변의 정확성을 위해 확인이 필요한 사항은 즉시 재질문을 통해 확인하며, 확인이 어려울 경우 'INFO'라고 표기하고, 현지조사 등 다른 수단을 통해 정보의 정확성을 검증하도록 한다.
- 인터뷰 시 고덕임, 적절한 호응 등을 통해 답변자가 편안하게 답변할 수 있는 분위기를 형성한다.

○ 설문조사

설문조사 시에는 평가항목을 고려하여 설문 문항을 작성한다. 설문 응답자를 고려하여, 응답자의 눈높이에 맞는 설문문항을 설계한다. 필요 시 국내/국외용으로 구분하여 작성한다.

Tip 설문지 작성 시 유의점

- 질문의 수는 가급적 20개 내외로 유지
 - 문헌조사에서 충분히 확인할 수 있는 사항은 과감히 제외
- 이해관계자와 관련 있는 질문 구성
 - 사업수혜자에게 국별협력전략(CPS) 관련 질문 ①

⇒ 수혜자 입장에서는 공여국의 국별협력전략(CPS)에 대해 제대로 인지하지 못할 수 있음.
- 구체적인 설문문항을 작성한다.
 - '예/아니오'로 답할 수 있는 단순 만족도 질문 ②

⇒ 좋지 않은 질문의 예 : "프로젝트에 만족하십니까?"

□ 2단계 : 자료분석

문헌분석 내용을 평가항목에 따라 정리하여 확인된 사항과 추가 확인이 필요한 사항을 구분한다. 이때, 분석 내용은 아래(표 21)와 같이 정리하되, 정보 출처를 명기하는 것이 유용하다.

11) 미리 준비한 질문리스트를 사용하되 답변내용에 따라서 필요한 질문을 추가하고, 질문 순서를 바꾸기도 하는 것

표 21. 자료분석 내용 정리 예시

평가기준	주요질문	하위질문	자료출처	자료분석방법
적절성				
효율성				
효과성				
영향력				
지속가능성				
일관성				
범분야이슈 (젠더/환경/인권)				

□ 3단계 : 국내조사 정리

문헌조사 결과에 국내 인터뷰 결과를 추가하여, 국내조사 결과를 총정리한다. 또한 정보의 정확성을 위해 재확인이 필요한 사항을 재점검, 정리한다. 국내조사 정리 결과를 토대로 현지조사 시 점검 필요사항을 명확히 한다.

□ 4단계 : 현지조사 준비

현지조사는 사업대상지의 현장과 사업성과를 점검, 확인하기 위해 실시한다. 현지조사는 책임자, 인터뷰 진행자, 기록자 등의 역할분담이 권장되나, 소규모 평가는 1인이 모든 역할을 담당할 수 있다.

현지조사 시 인터뷰 일정 주선 및 호텔, 차량 예약 등은 평가자가 주도적으로 실시한다. 이때 숙박 및 차량임차에 필요한 비용, 현지코디네이터 고용비용(통역, 각종 예약, 조사 보조 등에 활용) 등은 평가 예산에 반영할 수 있다.

KOICA 사무소는 일반적으로 평가 수행을 위한 수원국 정부협조가 필요할 경우 지원하는 것을 원칙으로 한다. 부득이한 경우, 현지정보 수집, 현지 컨설턴트 계약 등을 위해 KOICA 본부 평가소관부서 담당자를 통해 현지 사무소에 협조를 요청할 수 있다.

평가자는 현지조사 수행 2주 전 평가소관부서에 현지조사계획서를 제출한다. 현지조사 계획서는 자율양식으로 제출하되, 출장자, 조사기간 및 대상지역, 일자별 주요 일정, 면담자 목록 및 주요 면담 내용, 설문조사 및 면담조사지, KOICA 사무소 협조 요청사항 등을 포함하여 작성한다.

표 22. 평가자와 KOICA 사무소 간 업무 분장 예시

평가자	KOICA 사무소
수원국 정부관계자 인터뷰 대상자 선정 및 인터뷰 질문지 작성	수원국 정부관계자 인터뷰 일정 주선
타 원조기구 및 수원국 내 이해관계기관 인터뷰 대상자 선정 및 질문지 작성	타 기관 인터뷰 일정 주선
출장제반사항 (호텔, 차량 예약 등)	공항 Pick-up / Drop-off (치안상의 이유로 사무소 판단 하 필요한 경우)
직접수혜자 인터뷰 질문지 작성 및 실시 설문조사 문항지 작성 및 실시 - 사전 검토(Pre-test) 진행	본부 담당자 미동행시 조사 착수/ 최종 보고 회의 동행 또는 참관
현지 이해관계자 워크숍 (필요시)	주요 워크숍 참관
현지 컨설턴트 계약 및 교육 (사용 언어, 평가 목적 및 계획 사전 교육)	현지 컨설턴트 섭외 협조



참고사항

- KOICA 평가 담당자에게 영어 통역요청은 바람직하지 않다.
- 현지 출장 제반사항(호텔 및 차량 예약, 통역 섭외 등)은 평가자가 주도적으로 준비한다.
- 평가 윤리 준수 차원에서 본부 및 사무소(주요 이해관계자)의 예산으로 평가자-본부 및 사무소 간 오찬 및 만찬 실시를 금지한다.

표 23. 현지조사 사전 확인 필요사항(체크리스트)

구분	확인 필요사항
국내조사	• 문헌조사 결과 • 설문지 1차 분석 결과 • 인터뷰 지침 및 설문문항 • 인터뷰 모의시험
현지조사	1) 행정관련 사항 • 현지조사 수행계획 본부 보고 및 승인 • 현지사무소 사전 연락 2) 제반 사항 • 현지 컨설턴트 섭외 • 항공권/숙소 예약 • 비자발급 • 이동수단(차량, 국내선 항공 등) 예약 3) 인터뷰 관련 • 인터뷰 대상자 및 일정/장소 확정 • 인터뷰 질문지 사전 송부(국/영문본, 필요시 현지어 번역본) • 통역 섭외 • 준비물(설문지, 메모장, 녹음기, 카메라, 필요시 인터뷰 참가자 선물 등)

Tip 현지 컨설턴트 계약 시 필수 기재사항 예시

- 과업내용
- 고용기간 및 근무시간(1일 근무시간 등)
- 임금
- 정보보안 및 기밀유지 :평가수행과정에서 취득한 비밀 또는 사업 관련 정보, 이해관계자 면담 정보를 계약기간 중은 물론 계약 해지 및 만료 후에도 계약자의 사전 승인 없이 타인 또는 외부 공개 불가
- 평가 윤리 준수 : 계약서 하단에는 계약자와 계약상대자의 성명을 기재하고 서명 날인

※ 필요시 상기 항목 수정·보완 가능

2) 현지조사 실시

□ 1단계 : 현지조사 수행

표 24. 현지조사 수행절차



평가자는 현지 도착 후, 평가 참여 조사원들과 착수 회의를 통해 현지 활동 계획을 점검한다. 본격적인 현지조사 착수를 위하여, 활동계획에 대해 사무소에 보고하고, 수원국 정부기관과의 착수회의 개최로 현지조사를 시작한다. 이를 위해 평가목적, 기준, 주요 평가문항, 현지 활동 계획 등에 대해 간략한 발표내용을 영문 또는 현지어로 준비한다.

평가자는 필요 시 1, 2팀으로 나누어 조사를 진행할 수 있으며, 매일 일정시작 전/후에 일일 점검 회의(Daily debriefing session)를 갖고 조사원들 간 일일 계획 확인 및 주요 발견사항을 공유하고, 다음날 계획을 점검한다.

현장 인터뷰 시에는 반드시 진행자와 기록자의 역할을 분리한다. 여러 명을 인터뷰하는 경우 인터뷰 대상자에게 순차적으로 번호를 부여하여, 인터뷰 내용을 체계적으로 기록하고, 인터뷰 대상자의 개인정보를 보호하도록 한다.

Tip 효과적인 현지조사를 위한 팁

- 최종정리와 확인 및 사무소 공유를 위한 일정을 미리 정해두어야 한다.
 - 모든 자료를 현장에서 확보하는 것을 원칙으로 설정한다. 현지에서 모든 자료를 확보하기 위해서는 현지조사 계획을 상세히 수립하고, 현지 관계자들에게 사전에 필요한 자료를 요청해 놓는 것이 중요하다.
 - 현지문화를 존중하며 협조와 참여에 대해 감사 인사를 전한다.
 - 평가 수행자는 녹음이나 녹취, 자료의 복사, 설문 및 인터뷰 등을 실시할 때에는 반드시 대상자의 사전 동의를 받도록 한다(형식적으로는 문서 형태가 선호되나, 상황이 여의치 않다면 구두 동의를 구한다). 동의를 구하는 과정에서, 조사 및 연구의 목적을 명확히 조사 대상자에게 밝히고, 대상자로부터 수집된 자료가 어디에 쓰일지에 대해 설명을 해주며 응답자가 자유의사에 의해 결정할 수 있음을 강조한다.
 - 이때, 조사대상자가 응답한 내용에 대해 기밀이 유지될 것(익명성 보장)이라는 점을 이해시켜야 한다. 이는 응답자가 자신에게 불이익이 될 것을 염려해 응답 자체를 회피하거나, 중립적인 대답을 하는 경향을 보일 수 있기 때문이다. 또한, 익명성 보장을 위해 보고서 작성시에도 주요 조사 대상자는 실명이 아닌 이니셜로 표기한다(예 : 수원기관 담당자 A, 훈련교사 B 등).
-

Tip 현장기록 정리(Note-taking)

- 인터뷰 기본정보(날짜/시간, 인터뷰 대상/장소 등)부터 기입
 - 추가 질문, 추후 정리 등을 위해 빈칸을 남겨두기
 - 주요사항을 중심으로 전략적으로 노트 정리하기
 - 간결하게 작성하기(약자 등 활용)
 - 질문지에 직접 작성하기
 - 인터뷰 대상자의 답변과 나의 생각 구분하여 작성하기
 - 전체적인 상황(바디랭귀지, 분위기, 태도 등) 파악하기
-

Tip 사전 동의 구하기

- 조사/연구의 목적 및 조사 참여자의 권리를 설명하는 내용의 사전 동의서를 준비한다.
 - * 동의서는 조사 참여자가 이해할 수 있는 언어로 작성(영어 또는 현지어)
- 조사 참여자가 문맹일 경우, 동의서를 천천히 명확하게 읽어준 후 동의서 확인을 요청한다.
 - * 필요 시 동의서의 내용을 구체적으로 설명
- 조사 참여자가 글을 읽을 수 있는 경우, 동의서를 읽을 시간을 주고 확인 서명을 요청하고 사전 동의서 사본을 조사 참여자에게 전달한다.
- 수원국에서 요구하는 양식이 있을 경우, 이를 준용한다.

표 25. 사전 동의서 예시 (1)

Informed Consent Form for Interview

Good morning/afternoon! My name is _____. I am a member of the evaluation team on _____ project title in _____ region, country name _____ carried out by KOICA.

The evaluation at project end is vitally important as it enables KOICA to have an opportunity to look over the whole process and accomplishments of the project, as well as what's needed to increase project effectiveness in the future. At the same time, we consider that our partner's perspective is valuable to make better development impact while fostering partner's ownership on the project outcome. Therefore, we at KOICA would like to listen to your opinion so that we can incorporate your constructive feedback and suggestions into our future projects execution.

We would be very grateful if you could spend some time to answer our questions in this interview. We will not put your name or registration number in this format and all the information you give us will be kept strictly confidential. Your participation is voluntary and you are not obliged to answer any questions you don't want to answer.

Do I have your consent to continue?

If respondent's answer is 'YES' Continue;

if 'NO', stop the interview and go to the next respondent.

Interviewee:

Name: _____ Signature _____

Checked by evaluator:

Name: _____ Signature _____

표 26. 사전 동의서 예시 (2)

FACILITATOR'S GUIDE

[FOCUS GROUP DISCUSSION FOR WATER AND SANITATION MANAGEMENT TEAM]

WATER AN SANITATION IN KRACHI EAST AND WEST DISTRICTS IN THE VOLTA REGION

Informed Consent

Good morning/afternoon. My name is My colleagues and I are undertaking a data collection exercise in this community on behalf of Korea International Cooperation Agency (KOICA). KOICA has implemented a project in this area aimed at improving the Water, Sanitation and Hygiene situation and also domestic violence. We would like to ask you a number of questions about the water, sanitation and hygiene situation in this community and we would be grateful if you can take some time to answer them. The discussion will take about 30 minutes. You are under no obligation to answer any of the questions. However, if you choose to participate, nothing you say will be used against you now or in the future. I also promise that the information you give will be used solely for the purposes of the project. Therefore, we encourage everybody to participate and provide us with accurate information to our questions.

If members are willing to participate, please tick the box ☐ and begin the discussion. However, if a member expresses disinterest or unwillingness to participate, that person can opt out.

Guidelines

- 1) *Make sure that a good a representation (50% and more, leaders of the group and women members are represented) of the group is present.*
- 2) *Care must be taken to ensure that the meeting place is culturally acceptable and conducive for the discussion. Preferably, if the group has an office that can accommodate the discussion use it.*
- 3) *The facilitator needs to ensure that all members as much as possible are given a chance to speak and that no one's voice dominates the proceedings*
- 4) *Some of these questions are closed-ended and some are open-ended. For the open-ended questions, the note taker should take careful notes that will later be typed.*

Name of Facilitator: _____	Facilitator's guide:	Date of Focus Group: ____ / ____ / ____ dd / mm / yy
Name of Note Taker : _____	Focus group with WATSAN Committee/WSDB	No. of members in attendance: M ____ F ____
Name of Community: _____		Time Started: _____
Name of District : _____		

표 27. 인터뷰 기록 예시

기록물 번호 (Archival) #	:	CCP001
인터뷰대상자 (Interviewee)	:	
인터뷰장소 (Site)	:	
인터뷰자 (Interviewer)	:	
날짜 (Date)	:	yyyy-mm-dd
시작시간 (Start)	:	
종료시간 (End)	:	

질문 (Questions)	답변 (Responses)	관찰사항 (Observations)
(키워드 또는 질문번호)	(핵심단어 중심으로 정리)	(의견, 추가 확인 사항 등)


그림 4. 인터뷰 기록 잘못된 예

[illegible]

표 28. Focus Group Interview 예시

기록물철 (Archival) #	: CCP001	
인터뷰대상자 (Interviewee)	:	
인터뷰장소 (Site)	:	
인터뷰자 (Interviewer)	:	
날짜 (Date)	: yyyy-mm-dd	
시작시간 (Start)	:	
종료시간 (End)	:	
질문 (Questions)	답변 (Responses)	관찰사항 (Observations)
(키워드 또는 질문번호)	(핵심단어 중심으로 정리)	(의견, 추가 확인 사항 등)

그림 5. FGI 참가자 배석도

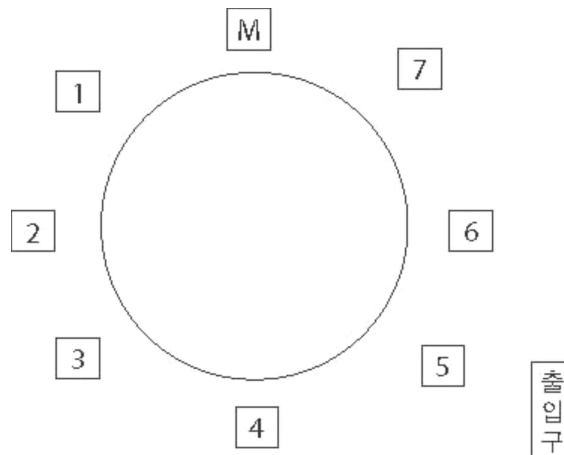

- 기록자는 응답자의 배석 번호와 답변내용을 함께 작성함

표 29. 현장 사진 기록 예시


기록물철 (Archival) #	CCP001
촬영 장소 (Site)	
배경설명 (Description)	
날짜 (Date)	yyyy-mm-dd

그림 6. 현장사진 잘 찍은 예시



- 사업의 특성을 잘 보여주는 사진
- 대상이 정면을 향하고 있는 사진
- 촬영구도가 안정적인 사진

그림 7. 현장사진 잘못 찍은 예시

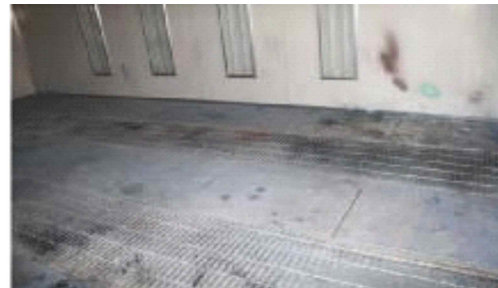

- 이곳은 어디인가요?
- 건물/기자재의 경우, 현판/공여 안내판을 중심으로 어느 곳인지 알 수 있게 도와주세요.

Tip

현장사진 잘 찍기

- 언제, 어디서, 어떤 상황에서 찍은 사진인지 기본정보 기록하기
- 정면으로 찍으세요. (뒷모습 보이지 않게 주의)
- 표현하고자 하는 상황이 잘 나타나게 찍으세요.
- 생생한 현장을 도와주세요!

□ 2단계 : 현지조사 마무리 (Wrap-up)

수집된 자료 중 필요한 것과 필요하지 않은 것을 구분한다. 수원국 측에서 추가로 제공하기로 한 자료가 확보되었는지 점검하고, 출국 전 자료 확보가 어려울 경우, 수원국 측 담당자(Contact point)를 지정하여 귀국 후에도 확인토록 한다.

설문조사를 실시한 경우, 설문조사 응답결과를 엑셀양식에 정리하고(coding), 설문지 원본은 추후 확인을 위해 필요할 수 있으므로 수거해 온다.

현지조사 시 획득한 자료 목록을 문서의 수준별로 정리하여, 국내조사 시 활용했던 문헌조사 목록에 덧붙여 추가한다.

- 현지조사결과를 평가항목에 따라 정리해 본다.
- 귀국 후 추가적으로 진행해야 할 사항을 점검한다.

마지막으로 일정상 가능할 시 수원국 및 사무소와 조사결과를 공유한다. 현지 상황에 맞춰 조사내용, 추후 확인 필요사항, 협조 요청사항, 향후 일정 등을 발표한다. 이후 귀국 후 2주 내 현지조사 결과보고서를 작성하여 평가소관부서에 제출한다. 현지조사 결과보고서는 자율양식으로 제출하되, 최종 출장일정 및 출장자 명단, 일별 활동내역(회의록 및 참석자 명단, 주요 관찰사항 등 포함), 향후 추진계획, 출장 사진 등을 포함하여 작성한다.

3) 비대면원격조사 수행 유의사항 12)

코로나 19 등으로 인해 물리적 현장방문이 불가한 경우, 평가팀은 화상회의, 동영상 촬영, 현지 평가인력 고용 등의 방법을 활용하여 비대면 원격조사를 수행할 수 있다. 평가팀은 사업평가를 위한 비대면원격조사 수행 시 유의사항을 숙지하여, 직접 현지 조사 수행이 어렵거나 비효율적인 특수상황 아래 평가 효과성 및 현지 접근성을 제고할 수 있다.

○ (현지평가인력 활용) 역량있는 현지 평가인력을 섭외 및 활용하여 현지조사를 수행하기 위해서는 명확한 과업 범위 설정 및 현지 조사수행을 위한 교육·훈련 및 가이드라인(프로토콜) 제시, 현지평가인력 풀 확보 등을 고려해야 한다.

- 현지 평가인력 섭외는 외부플랫폼(예: Linked-in 등), 동일 국가/지역 평가 수행 팀 및 사무소 추천, 평가실 현지 평가인력 Pool 등을 활용할 수 있으며, 개별 컨설턴트 외에도 현지연구소(Think tank), 대학교, CSO 등 조사수행 가능 기관에 접촉하는 방안을 고려 가능함.
- 인력 섭외 및 계약과정에서 명확한 과업 기간, 과업 범위, 산출물 품질기준들을 명시한 과업지시서(ToR)를 상호합의 하에 작성할 것을 권고함.
- 본격적인 조사 과업 착수 이전에 현지평가인력의 평가대상사업 이해도 제고 및 주요 조사 결과의 왜곡 및 누락 가능성 최소화를 위해 조사수행 시 유의사항을 포함한 가이드라인 제시 및 교육·훈련 실시를 권고함.
- 현지평가인력을 활용한 평가보고서 발간 시 해당 인력을 평가팀의 일원으로 반영하여 보고서 내 ‘평가보조원’ 혹은 ‘현지 컨설턴트’로 명시할 것을 권고함.
- KOICA 평가실은 사업평가 수행에 활용한 현지 평가인력 정보를 활용하여 현지 평가인력 풀을 구축하고 있으며, 평가팀은 현지평가인력 활용 시 사업평가 참여 현지평가인력의 이력서를 포함한 주요 정보 및 개인정보활용동의양식을 최종 산출물과 함께 제출해야 함.

○ (데이터수집 효율화방안) 데이터 접근가능성 및 예상 제약조건을 고려한 정보수집 계획 수립, 새롭고 다양한 종류의 사전정보 수집, 다양한 원격 플랫폼과 방식을 활

12) UNDP(2020). *Evaluation during COVID-19: Data collection, remote interviews and use of national consultants*를 참고하여 작성

용한 조사수행방안을 고려해야 한다.

- 평가지표의 타당성, 적합성 외에도 데이터 접근 가능성 및 정치, 사회·문화, 안보적 차원의 현지 제약조건 등을 고려하여 평가 프레임워크 및 정보수집계획을 수립해야 함. 만약 지표 데이터 수집상의 어려움이 예상될 경우 대체 활용지표의 타당성 및 접근 가능성을 사전에 검토할 것을 권고함.
 - 직접 수집정보의 제약요건을 극복하기 위해 확장된 사전 문헌조사를 권고함. 예를 들어, 기본적인 사업유관문서, 국가정책 및 전략문서 외에도 대중매체, GIS 위성사진 등의 직·간접 참고자료를 통해 평가대상사업 및 대상 지역 맥락 이해도를 증진할 수 있음.
 - Zoom, Skype, WhatsApp, google docs 등의 원격 플랫폼을 다양하게 활용하되, 현지 통신 사정 및 인터뷰 대상의 해당 플랫폼 이해도 등을 사전에 충분히 고려하여 선정하여야 함. 또한 주어진 시간 내 쌍방향 의사소통의 효율성을 높이기 위해, 평가 및 인터뷰 목적, 주요 질문사항 및 기재사항 등을 사전 공유할 것을 권고함(서면 혹은 현지 인력을 활용한 구두 전달).
 - 현지평가인력이 수집한 데이터와 사전 문헌조사 및 원격 조사를 통해 한국 전문가가 수집한 정보 간의 교차검증을 실시하여 평가 결과의 신뢰도와 타당성을 확인해야 함.
 - 원활한 의사소통 및 안전성을 고려하여 대규모 인원 소집 인터뷰보다는 1-2인 규모의 소규모 인터뷰 수행을 권고함.
 - 현지와의 시차, 원격조사 수행을 위한 사전 공지 및 일정 조율작업, 현지 내 이동제한(락다운) 등 돌발상황 발생 가능성, 현지평가인력 교육·훈련 등을 종합적으로 고려하여 현지출장 직접조사 대비 충분한 일정 및 타임라인 설정을 권고함.
- (평가윤리 준수) 현지평가인력, 수혜자 및 이해관계자 그룹의 권리 침해를 사전에 방지하고 보호할 수 있는 조치를 마련해야 한다.
- 현지조사 수행 시 현지평가인력의 안전을 우선순위에 두고 의사결정을 해야 함. 예를 들어, 코로나 19 및 기타 안보 이슈로 인해 수원국 내 지역 간 이동 제한 조치가 내려지거나, 별도 조치가 없더라도 현지인력의 직접 출장 및 데이터 수집 시 위험 가능성이 감지된다면 대체 및 보완조사 방법을 활용해야 함.
 - 현지평가인력을 대상으로 한 비윤리적 언행, 행동, 업무지시 및 강요가 없도록

상호존중이 필요함. KOICA 평가실은 윤리준수도 평가양식 영문 개정을 통해 현지평가인력-국내평가전문가-KOICA 간 상호 점검이 가능한 체계 개편을 계획하고 있음.

- 대상사업 수혜자 및 이해관계자의 개인정보 보호조치 및 민감한 정보제공에 대한 익명성 보장을 위한 사전조치 마련을 권고함(그룹별 분리 면담실시, 익명 설문 응답양식 활용 등).
- 원격플랫폼을 통한 수혜자 의견 및 정보 수집 시 디지털취약계층(여성, 노인, 어린이) 소외를 방지하기 위한 방안을 마련할 것을 권고함.

4) 현지조사 결과 제출

평가자는 현지조사를 완료하고 귀국 후 2주 내 현지조사 결과보고서 혹은 종료평가 결과보고서 초안을 평가소관부서에 제출한다. 현지조사 결과보고서는 자율양식으로 제출하되, 최종 출장일정 및 출장자 명단, 일별 활동내역(회의록 및 참석자 명단, 주요 관찰사항 등 포함), 향후 추진계획, 출장 사진 등 포함하여 작성한다.

5) 중간보고회 실시

평가자는 특별한 경우를 제외하고는 현지조사 1개월 이내 혹은 평가 완료 전 2개월 이내에 중간보고회를 실시하고 평가소관부서에 중간보고서를 제출한다. 중간보고서에는 해당 시점까지 완료된 평가 결과 및 현지조사 결과를 포함하며, 가능할 시 평가교훈과 환류과제(안)의 초안을 포함하여 해당 내용의 타당성 및 실현가능성에 대한 유관부서 의견을 수렴한다. 중간보고서는 별도 양식 없이 평가 결과보고서 양식을 준용한다. 단, 평가 수행기간이 짧거나 기타 사유로 중간보고회 개최가 불요할 경우 평가소관부서 판단하에 해당 보고회를 생략하거나 서면 보고로 대체할 수 있다.

표 30. 중간보고회 추진목적 및 주요 산출물

단계	추진 목적(주요 확인 사항)	주요 산출물
중간보고회	1) 중간보고까지 평가 결과(현지조사 결과 포함) 2) 대략적인 사업평가 결론, 방향성	중간보고서(안) (현지조사 결과보고 포함)

6) 최종점검회 실시

평가자는 피평가부서 및 이해관계자를 초대하여 최종점검회를 필수로 실시한다. 평가자는 최종점검회 개최 최소 2주 전 평가보고서 및 교훈리포트, 환류과제 이행방안 등 산출물 초안을 평가소관부서에 제출해야 한다. 최종점검회는 평가자가 1차적으로 도출한 평가 제언에 대해서 주도적으로 추진하며, 해당 회의 결과를 반영하여 평가보고서(교훈 및 환류과제 포함) 최종본을 작성한다.

피평가부서와 환류과제 이행부서로 지목된 유관부서는 평가 결과 초안에 대해 환류과제 검토서 및 사실관계확인서 초안을 사전 제출하고 최종점검회에 참석하여 의견을 제시한다. 피평가부서는 평가 교훈 및 환류과제의 실효성 및 사실 부합성에 따라 평가 교훈, 환류과제(안)을 채택 또는 미채택할 수 있다.

파트너십사업의 경우 파트너기관 담당자 최소 1인이 최종점검회에 참석하여 관련 의견을 제시할 수 있도록 조치해야 하며, 환류과제검토서 및 사실관계확인서는 별도로 수령하지 않는다. 만약 파트너기관의 참석이 어렵거나 한국 본부가 없는 국제기구의 경우에는 피평가부서 및 사무소에서 해당 파트너기관의 의견을 1차 수렴하여 최종점검회에 참석하고, 해당 내용을 환류과제검토서 및 사실관계확인서 내 반영한다.

평가소관부서는 최종점검회 개최 1주일 전 평가자가 도출한 평가보고서 초안 및 교훈리포트, 환류과제 이행방안에 대해 피평가부서 및 유관부서(환류과제 이행부서)의 환류과제검토서 및 사실관계확인서 초안을 수령하여 평가자에 전달한다. 이후 최종점검회 개최 1달 이내에 최종점검회 주요 논의내용을 작성하여 평가자, 피평가부서, 유관부서에 배포한 후 해당 내용을 반영한 최종 평가결과보고서, 교훈리포트, 환류과제 이행방안, 환류과제검토서 및 사실관계확인서를 접수한다.

평가주관부서(평가실)는 워크숍의 퍼실리테이터(facilitator)로 참여한다.

표 31. 최종점검회 추진목적 및 주요 산출물

단계	추진 목적(주요 확인 사항)	주요 산출물
최종점검회	1) 최종적인 평가 결과(안) 2) 사업평가 등급(안) 3) 교훈 및 환류과제(안)	평가 최종보고서(안) * 평가결과(안), 사업평가등급(안), 교훈 및 환류과제(안)

3. 종료평가 결과 제출

1) 종료평가 결과보고서 작성 및 제출

평가자는 평가 종료 후 평가결과 요약, 평가개요, 성과달성도, 기준별 평가결과, 교훈 등을 포함하여 평가 결과보고서 등 평가결과물을 별첨 양식을 참고하여 작성한다. 보고서의 통일성을 기하고, 일정 품질을 유지하고자 첨부 양식을 준용하여 평가 결과보고서를 작성하여야 한다.

이후 평가자는 계약종료일 1개월 전까지 평가 결과물을 평가소관부서에 제출한다.



평가결과물

① 종료평가 결과보고서

- 평가결과물 편집 규칙 및 양식은 「종료평가 업무 수행 길라잡이」 준용
- 40페이지 이내로 작성하며, 첨부 양식의 분량제한은 없음

② 종료평가 등급 결과표

③ (해당시) 분야별 교훈리포트

④ (해당시) 환류과제 이행방안

⑤ 참고문헌

※ 평가자는 평가 결과물 일체를 제공하는 표준양식의 파일형식의 확장자(hwp, word, excel, ppt)로 저장하여 제출하며, pdf 변환하여 제출하는 것을 금함(평가 품질검토 시 블라인드 마스킹 처리 필요)

표 32. 종료평가 결과보고서 목차 및 세부 구성

목 차	세부 구성	분량(쪽)
I. 평가결과 요약	1. 국문 요약	3
II. 대상사업 개요	1. 추진배경 2. 사업개요(사업개요서 최종본 사용) 3. 사업설계매트릭스(PDM or ePDM)	5
III. 평가개요	1. 평가의 목적과 범위 2. 평가 매트릭스(Evaluation matrix) 3. 평가 방법 4. 평가의 한계 5. 평가팀 구성 및 시행체계	5
IV. 성과달성도	1. 성과달성 요약표	1
V. 기준별 평가결과	1. 적절성 2. 일관성 3. 효과성 4. 효율성	20

목 차	세부 구성	분량(쪽)
	5. 지속가능성 (준비도) 6. 범분야 이슈, 그 외 평가기준 (선택)	
VI. 결 론	1. 결론 2. 작동요인 및 비작동요인 3. 환류과제 및 교훈	6
합 계		40
첨 부	1. 평가결과 국·영문 요약 2. 현지(원격)조사 개요(출장자·출장일정·출장지) 3. 일별활동내역(주요협의내용 및 평가활동 정리 서술) 4. 면담자 목록 및 주요 면담 질문 5. 설문조사지 및 설문조사 결과 6. 참고문헌 목록 7. 그 외 평가보고서 첨부자료 일체 (경제성분석 결과, 면담/설문조사/시설점검 결과 등)	

KOICA는 평가결과물이 편집 규칙 및 양식을 준용하지 않았을 경우에 평가자에게 보완을 요구할 수 있으며, 그 외 평가결과 내용에 대한 수정 요구는 불가하다. 다만, 피평가부서에서는 평가보고서 수령 후 '환류과제검토서 및 사실관계확인서'를 통해 평가 결과에서 도출된 평가 제언 및 권고사항의 적절성, 수용 가능여부 또는 향후 조치 사항 등에 대해 별도 기술한다.

※ 피평가자 의견서 작성지침

평가 독립성 확보를 위해, 사실이 아닌 것은 상세 설명을 하고 평가자에게 수정을 별도로 요구하지 않습니다. 독자들은 평가자의 주장과 KOICA 측의 설명 내용을 보고 스스로 판단합니다. KOICA는 이러한 상호간의 이견을 공식화하여, 1) 평가자의 의견만 일방적으로 여론화되는 것을 지양하며, 2) 일부 평가자들이 의견수정을 요청받아 평가 독립성에 의문을 가지는 것을 예방하고, 3) 양자간 학습의 기회로 삼아, 구체적인 근거에 기반한 평가결과 도출 및 환류 유용성을 제고하고자 합니다.

2) 평가윤리 준수도 평가 참여

평가 수행과정에서 불법행위 또는 비윤리적 행위 발생을 방지하기 위한 목적으로 종료평가 평가결과물 접수 후 결과보고 시 피평가자(사업관리부서·사무소)와 평가자가 상호평가 형태로 평가윤리 준수도를 평가한다. 평가자는 종료평가 평가결과물 제출 시 평가윤리 준수도 평가에 참여한다. 관련 세부사항은 동 길라잡이의 18-19페이지에서 참고할 수 있다.

평가자(평가책임자) 별 평가 윤리 준수도 평과 결과는 축적되어 추후 평가자 선정 시 해당 평가 결과를 참고할 수 있으며, 피평가자의 경우 평가윤리 준수도 평가 결과에 따라 별도 교육, 처분 등을 받을 수 있다.

4. 종료평가 결과 환류 및 공개

1) 종료평가 품질검토

KOICA 평가주관부서(평가실)는 종료평가가 완료된 모든 사업의 평가결과물을 대상으로 전사적 평가 품질관리를 실시한다. 품질검토 단계에서는 외부전문가 그룹¹³⁾을 통해 평가 방법론 및 데이터 적정성 등¹⁴⁾ 대상 평가결과물의 품질을 Pass/Non-Pass 방식으로 검토한다.

품질검토 시에는 평가자의 정보를 밝히지 않는 블라인드 검토를 원칙으로 「평가 품질관리 기준」과 「평가 품질검토 결과표」를 준용하여 평가결과물 및 평가자가 참고했던 사업관련 필수문서를 검토한다. 관련 세부사항은 동 길라잡이의 12-17페이지에서 참고할 수 있다.

평가수행기관 동기부여 및 평가보고서 품질 상향평준화와 우수 평가보고서를 기반으로 한 동료학습 유도를 위해 평가품질정보(등급, 점수)는 평가자 동의하에 보고서 본문과 함께 대외공개한다. 평가품질 미흡(D등급) 보고서는 사업 평가등급을 무효처리 및 삭제하고 대외공개하며, 이 경우에도 평가품질정보는 보고서와 함께 대외공개한다.

평가 품질기준 부합 여부(Pass/Non-Pass)에 따라, 피평가자(평가소관부서)는 평가자에 보고서 등 평가결과물 보완을 요청할 수 있으며, 평가자는 평가 품질검토 결과 최초 D등급이 부여된 경우, 1회에 한해 보고서 보완 및 재검토 의뢰가 가능하다. 단, 이 과정은 평가자가 희망하는 경우에 한해 보완 추진하며, 평가자 미희망시 평가품질은 D등급으로 확정하게 된다. 이 경우, 보고서 등 평가결과물 보완은 평가자 희망에 의한 사후적 결과 보고서 수정 제출에 해당하는 것으로, 계약변경은 불요하다. 수정본이 제출된 경우 품질 재검토를 통해 B~D등급 이내에서 등급 부여가 가능하다.

13) 평가주관부서인 KOICA 평가실에서는 공공·학계·시민사회 등 평가 전문가 풀에서 심사위원 3명이 종료평가 결과 품질 검토에 참여하며, 민간참여를 통한 평가정보 신뢰도 제고와 평가품질지수 관리 등을 도모

14) 필요시 검토 과정에서 패널위원은 평가자에게 서면질의하여 평가자의 답변 참고 가능

2) 종료평가 결과 종합분석

KOICA 평가주관부서(평가실)는 전년도에 계획한 종료평가 과업이 완료되는 시기 혹은 환류 워크숍 실시를 위한 신규 평가정보(사업성과 평가등급, 평가품질 등급 등) 수집이 마감되는 시기(2/4분기)를 기준으로 평가결과 종합분석을 실시한다. 동 분석 작업은 해당연도 종료평가 종합분석 및 연차별 추이 분석을 포함하여 세부분야별로 누적되는 평가결과를 횡적종합분석하는 분야별 평가교훈분석, 평가품질검토과정에서 도출되는 독립평가패널 평가자 피드백 분석 등을 포함한다. 단, 평가 품질기준이 부적합한(D등급, Non-pass) 평가결과는 분석에서 제외한다.

평가실은 해당 종합분석 결과를 이해관계자별 맞춤 형태로 공유하며, 이해관계자는 평가정보를 각종 의사결정에 활용한다.

- (경영진·이사회) 우수 사업 확산 및 사업경영개선 과제 선정 등 의사결정에 활용
- (유관부서) ▲ 유사사업 추진 시 개별사업의 교훈 및 제언 등 참고 ▲ 환류과제 수용 및 개선 실시
- (대내·외) 종료평가 결과 및 피평가자 의견 환류 결과 지식플랫폼 공유

3) 종료평가 결과 환류 · 공유워크숍

KOICA는 ▲종료평가 종합 환류워크숍(연 1회 개최), ▲파트너기관 평가 결과 공유 워크숍, ▲현지 환류워크숍, ▲EvalPeople 평가 결과 공유워크숍, ▲평가포럼 등 평가 제언 분석 결과에 기반하여 향후 평가품질 제고 및 환류방안을 모색하기 위한 평가환류워크숍을 이해관계자 맞춤형으로 개최하고 있다. 이러한 기회를 통해 평가주관부서(평가실)는 평가결과 및 제언사항에 기반한 환류과제(안)을 유관부서에 제안 및 공유하고, 워크숍 및 후속 논의를 통해 최종 환류과제를 도출한다.

평가자는 평가결과 환류·공유워크숍 개최 시, 주요 평가결과를 공유하고 토론에 참여하며, 이러한 논의사항에 기반하여 평가 산출물을 보완 제출하며, 특히 평가책임자 주도하에 수원기관에 직접 평가결과를 전달하는 수원국 환류워크숍(화상회의 원칙)을 사무소 수요 발생 시 실시한다. 현지 환류워크숍 개최를 통한 의견수렴 시에는 후속 사업 및 사후관리 관련 논의는 지양하며, 평가 결과의 타당성, 대상 사업의 성과관리 및 확산방안 등 평가와 직접적으로 관련된 논의에 집중한다.

4) 종료평가 환류과제 선정 및 이행

KOICA 평가주관부서(평가실)는 종료평가 결과 종합분석 시 제언 빈도 및 유관부서 이행(Action) 요구정도, 이행 타당성 등을 고려하여 환류과제 후보군을 도출한 뒤, 이행부서와의 후속협의 및 내·외부위원으로 구성된 평가위원회의 심의를 통해 최종 환류과제(안)을 확정한다. 환류과제 이행결과는 평가주관부서에서 주기적으로 이행 점검 및 관리한다.

표 33. 사업평가 환류과제 이행체계

이행단계	이행주체	주요 내용
1. 환류과제(안) 도출	평가실	사업평가 교훈 및 시사점 반영하여 과제(안) 도출 ↓
2. 환류과제(안) 협의	평가실	환류워크숍, 이행부서 후속협의 등 과제확정여부 협의 ↓
3. 환류과제(안) 확정	평가실	협의결과 반영하여 환류과제 목록 확정 ↓
4. 이행계획 초안 작성	이행부서	환류과제 이행계획 초안 작성 ↓
5. 당해년도 환류과제 심의 및 확정	평가실, 과제 이행 및 유관부서	- 평가위원회에서 연간 평가 환류과제 심의 및 확정 - 불수용과제 중 추가 검토가 필요한 건은 별도 안건으로 상정하여 최종 이행여부 확정 ↓
5. 최종 이행계획 작성	이행부서	- 평가위원회에서 확정된 연간 평가 환류과제에 대한 최종 이행계획 작성 및 제출 ↓
7. 이행결과 점검	평가실	계획대비 과제 이행 여부 반기별 정기점검

5) 종료평가 교훈 및 시사점 환류

환류과제화 되지 않았지만 후속사업 및 유사사업 수행 시 참고할만한 사업작동요인(worked) 및 개선요인(not worked)을 KOICA 평가주관부서(평가실) 주도하에 분야별 교훈리포트 및 체크리스트 형태로 누적 관리하며, 이를 평가교훈 기반 학습공동체(COP) 운영, 분야별·국별·주제별 평가 세미나 등의 계기로 환류한다.

또한 신규사업 발굴 시 유사사업 교훈 분석에 평가 교훈 및 평가 결과보고서 내용을 참고하도록 전사 사업발굴지침 내 명시하고 있으며, 평가주관부서인 평가실에서 신규사업 심사과정에 참여하여 유사사업 및 이전단계 사업의 교훈환류 여부, 사업 M&E 계획 수립의 적정성 등 관련 항목을 검토하고 의견을 제시하는 등 평가 결과 및 교훈을 환류한다.

6) 종료평가 결과 공개

품질검토가 완료된 평가결과물은 「사업 평가규정」에 따라 대외공개하는 것을 원칙으로 하며, 공개 범위는 평가실 주관 품질검토를 거친 평가보고서의 본문 및 품질등급, 평가자 정보(이름, 소속, 평가자 역할)이다. 단, D등급 판정보고서의 경우 평가보고서 본문 내 사업 성과등급을 제외하고 공개한다. 평가보고서는 평가주관부서에서 KOICA 평가정보공개 플랫폼, ODA도서관 홈페이지 등을 통해 대국민 공개하며, 평가 완료 1년 이내 시점에 보고서를 공개하는 것을 원칙으로 한다.

평가 결과보고서는 평가책임자의 명의로 외부에 공개되며, 평가보고서 내용이 KOICA의 의견과 다를 수 있음이 공지될 것이다. 그 외 평가보고서 양식 및 준수사항은 「사업 평가규정」의 '[별표 2] 사업 평가자료 소프트웨어 양식 및 준수사항'을 따른다.

평가결과는 평가정보 공개플랫폼, LET(Let Evaluation Talk) 유튜브채널, 개발협력 평가포럼 등의 다양한 전달체계를 통해 이해관계자별 환류컨텐츠로 재가공되어 맞춤형 정보로 제공한다.

표 34. 이해관계자별 환류 체계

환류 채널	이해관계자	전달내용/초점
EvalCOP, 평가 간담회	- 사업평가 및 성과관리 전문가/종사자 - KOICA 사업평가 수행기관 및 전문가	- 개발협력 평가 주요 현안 공유 및 토의 - KOICA 평가 주요 외부고객 의견 청취
개발협력 평가포럼, LET (Youtube 영상)	- 개발협력 사업성과 및 주요 현안에 관심있는 학생, 실무자, 국민 등	- 우수사업 성과 확산 - 사업 추진상의 교훈 및 성공요인 홍보 - 개발협력 평가 주요 현안 및 방향성 공유
평가정보 공개플랫폼	- KOICA에서 생산하는 사업평가정보를 얻고자 하는 국민	- 평가보고서, 교훈리포트 등 평가정보 공개 - M&E 교육자료, 연구 결과 공개 - 그 외 평가 참고 자료 및 주요 규정, 입찰 및 공모 소식 등 공개

IV. 예산집행 및 정산

1. 평가 수행기관의 경우

1) 예산집행

평가 용역비는 당초 계약한 총 용역비 범위 내 집행이 원칙이며, 각 "대", "중", "소" 과목 내의 개별 계약금액을 초과 집행할 수 없다.

□ 예산전용

"대"과목 간의 전용은 불가함을 원칙으로 한다. 그럼에도 불구하고 "대" 항목 간의 전용이 필요한 경우, 사전에 협력단의 공문승인을 받은 후 전용하여 집행한다.

"중"과목 간 전용이 필요한 경우 협력단의 사전 공문승인을 받아 전용집행이 가능하다. "소" 과목은 동일 "중" 과목 내에서 자율 전용이 가능하나, 사업비 집행실적 보고 시 KOICA 평가 소관부서에 세부전용내역 및 사유를 세부전용내역 및 사유를 필히 보고한다.



참고사항

- 단, 평가예산(안)의 경우, "소" 항목이 없으므로 "중" 항목 내 "세" 항목끼리 전용으로 대체 적용하며, 당초 제안한 각 항목별 단가는 임의로 조정할 수 없다.
- 또한, 직접인건비의 경우 증액은 불가하며, 전문가 등급이 상향조정 되어야 할 경우 계약금액 변동 없이 가능하고, 하향조정 되는 것은 불가하다¹⁵⁾.

2) 선급금 지급

KOICA 평가주관부서 담당자는 평가 용역 계약이 체결되고 나면, 상세 예산항목에 따라 계산식, 항목의 타당성을 검토한 후, 선급금을 지급할 수 있다. 평가 수행팀은 착수보고회 이후 공문을 통해 선급금을 요청한다.



선급금 요청 시 첨부사항¹⁶⁾

- 1) 선급금 요청공문
- 2) 선금사용계획서
- 3) 선금보증증권
- 4) 세금계산서(부가세 포함)
- 5) 보험료 증빙(연금 또는 4대보험 완납증명서 등)

15) 예시 : 계약 시 1급 전문가 → 2급 전문가로 조정 (×), 계약 시 2급 전문가 → 1급 전문가로 조정 (○)

3) 중도금 지급

평가 수행팀은 평가보고서 초안이 완성되면 KOICA에 공문으로 제출하고, 해당 공문을 통해 중도금 지급 요청을 할 수 있다. 상호 협의에 따라 별도 중도금 지급 없이 잔금 지급으로 처리 가능하다.



중도금 요청 시 첨부사항¹⁷⁾

- 1) 중도금 요청공문
- 2) 최종보고서 초안 제출 공문 및 보고서
- 3) 보험료 증빙(연금 또는 4대보험 완납증명서 등)
- 4) 세금계산서(부가세 포함)

4) 회계법인 정산 검토

평가 수행팀은 최종 보고서 심사의견을 반영한 평가보고서 최종본 제출 후, 1개월 이내에 정산을 실시한다. 평가 수행팀은 KOICA 평가주관부서에서 지정한 회계법인에 검토자료를 제출하여 회계법인의 정산 검토를 받는다.



회계법인 정산 검토 시 제출사항

- 1) 정산내역서
- 2) 정산증빙

※ 모든 영수증은 원본제출이 원칙이나, 불가피하게 사본 제출하는 경우 원본 대조필 도장 및 서명 필요

평가 수행팀은 정산내역서와 정산증빙 자료를 평가실(사본) 및 정산용역을 수행하는 회계법인(원본) 측에 각각 송부한다. 정산필요서류 및 증빙목록은 매해 갱신되는 회계법인 정산안내자료를 참고한다.

5) 잔금 지급

회계법인의 정산 검토 후 정산검토 보고서가 완료되면, 아래 자료를 구비하여, KOICA 평가주관부서에 잔금 지급을 요청한다.

- 16) 제출서류는 계약 내용에 따라 상이할 수 있음
17) 제출서류는 계약 내용에 따라 상이할 수 있음



- 1) 잔금 요청공문
- 2) 최종보고서 최종본 제출공문 및 보고서
- 3) 보험료 증빙(연금 또는 4대보험 완납증명서 등)
- 4) 회계법인 정산검토보고서,
- 5) 세금계산서(부가세 포함)

2. 외부 전문가의 경우

1) 현지 조사비 지급

평가소관부서와 외부 전문가간 체결한 계약서에 근거하여, 평가소관부서는 현지 조사 시행 전 전문가 개인 계좌 또는 사무소 공용계좌를 통해 현지 체재비, 차량임차료, 통역비 등을 송금한다.

2) 국내 자문료 지급

평가 전문가가 현지조사 종료 및 종료평가 최종 결과물을 평가소관부서에 제출한다. 평가소관부서는 평가자(외부 개별 전문가)가 1) 평가보고서를 미제출하거나 정당한 사유 없이 보고서 제출에 응하지 아니할 경우, 2) 전문가의 귀책사유로 계약이 해지(해임)되는 경우, 3) 최종 평가품질등급 미부합(D등급) 시에는 기술료를 지급하지 아니할 수 있다.

3. 내부평가의 경우

평가자(KOICA 직원)의 현지 조사 착수 전 평가소관부서에서는 평가 수행 직원 또는 사무소에 체재비, 차량임차료, 통역비 등 현지조사에 필요한 비용을 송금한다. 현지 조사 종료 후 평가자는 귀국 후 2주 내에 현지조사 경비를 정산한다.

V. 각종양식 목록

1. 종료평가 용역 제안서 목차 및 작성지침
2. 평가투입인력 참여자격 확인 양식
3. 종료평가용 계약서 및 과업동의서 등 양식
 - 3-1. 전문인력 파견계약서 표준양식
 - 3-2. 종료평가 표준계약서(안)
※ 외부기관이 평가 수행하는 용역 계약 시, KOICA 국제기술용역계약서 표준(안) 준용
 - 3-3. 평가정보 공개 수용 서약서
 - 3-4. 평가 품질검토 결과 수용 서약서
 - 3-5. 개별인력 참여 동의서
4. 종료평가 수행계획서 표준양식
5. 종료평가 결과보고서 등 평가결과물 표준양식
 - 5-1. 종료평가 결과보고서 표준양식
 - 5-2. 종료평가 등급 결과표 표준양식
 - 5-3. 평가 교훈리포트 양식
 - 5-4. 평가 환류과제 이행방안 양식
 - 5-5. 현지 평가 컨설턴트 활용 조사표
 - 5-6. 현지 평가 컨설턴트 개인정보 수집 및 활용동의서
6. 환류과제검토서 및 사실관계확인서
7. 평가윤리 준수도 양식
 - 7-1. 평가윤리 준수도 평가 양식
 - 7-2. 평가윤리 준수 서약서
8. 평가 품질검토 결과표
9. 평가업무수행 길라잡이 FAQ
